

Projet : Création d'un Bullet Journal Web

Étude de Faisabilité & Dossier de Conception

Date de Rédaction Juin 2025

Chef de Projet

Massaid Safia

massaidsafia2@gmail.com

06 76 72 70 42

« Une solution numérique pour organiser, planifier et progresser avec fluidité. »

Confidentiel – Usage Interne

Toute diffusion partielle ou totale est soumise à autorisation préalable.

Table des matières

Numéro	Titre du Chapitre / Section
I.	Introduction
II.	Étude de Faisabilité
III.	Charte de Projet
IV.	Matrice RACI
V.	Énoncé de Portée (Scope Statement)
VI.	Plan de Communication
VII.	Budget Table (Tableau Budgétaire)
VIII.	Budget Table (Tableau Budgétaire)
IX.	Liste des taches
X.	Milestone Table (Table des Jalons)
XI.	Diagramme Gant global:
XII.	Journal des Risques (Risk Log)
XIII.	Work Streams (Flux de Travail)

I. Introduction

1.1 Présentation du Projet

Le projet intitulé « **Création d'un Bullet Journal Web** » a pour ambition de concevoir une plateforme numérique innovante, interactive et modulable, inspirée du concept traditionnel du bullet journal. Cette application web offrira aux utilisateurs une interface complète et intuitive permettant d'organiser, de planifier, de suivre leurs objectifs et de visualiser leur progression dans une seule et même solution centralisée.

L'outil sera structuré autour de modules clés tels que :

Dashboard (vue synthétique des activités),

Journal (prise de notes et enregistrements quotidiens),

Objectifs,

Calendrier,

Rétrospective,

Progression,

Paramètres,

Déconnexion.

Ce projet s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la productivité personnelle et professionnelle, tout en mettant l'accent sur la personnalisation de l'expérience utilisateur.

1.2 Objectifs de l'Étude de Faisabilité

L'étude de faisabilité vise à évaluer la viabilité du projet sous tous ses angles afin de garantir un développement maîtrisé, structuré et aligné sur les réalités du terrain. Elle poursuit les objectifs suivants :

Analyser la faisabilité technique : évaluer les choix technologiques envisagés, les contraintes d'intégration, les besoins en infrastructure, ainsi que les compétences requises.

Mesurer la faisabilité économique : estimer les coûts, identifier les sources de financement potentielles et évaluer le retour sur investissement (ROI).

Étudier la faisabilité opérationnelle : analyser les ressources humaines disponibles, la charge de travail, l'organisation projet et l'impact sur les opérations existantes.

Vérifier la faisabilité légale : s'assurer du respect des cadres réglementaires, notamment en matière de protection des données personnelles (RGPD) et de propriété intellectuelle.

En somme, cette étude a pour but de **réduire les incertitudes**, **anticiper les risques**, et **valider les conditions de succès** avant d'engager les ressources dans la phase d'exécution du projet.

II. Étude de Faisabilité

2. Analyse du Marché et des Besoins

Identification des Utilisateurs Cibles

Le projet vise :

Le **grand public** souhaitant mieux organiser son quotidien.

Les **professionnels** à la recherche d'un outil structurant.

Les **étudiants** pour la planification d'activités académiques.

Analyse des Solutions Existantes

Des outils comme Notion, Trello ou des apps de bullet journaling numériques (ex. Journey, Daylio) existent déjà.

Forces : Richesse fonctionnelle, expérience utilisateur fluide.

Faiblesses : Complexité d'utilisation, absence de personnalisation poussée pour certains profils.

Besoins Fonctionnels

Affichage d'articles : texte, images, vidéos.

Moteur de recherche et catégorisation.

Système d'abonnement ou de notifications.

Interface d'administration (CRUD sur contenu).

Modules : Dashboard, Journal, Objectifs, Calendrier, Rétrospective, Progression, Paramètres, Déconnexion.

Besoins Non Fonctionnels

Performance : temps de chargement < 2s.

Sécurité : protection des données personnelles.

Scalabilité : capacité à gérer l'augmentation du trafic.

Ergonomie : design intuitif et responsive.

3. Faisabilité Technique

Technologies Envisagées

Backend : Node.js/Express .

Frontend : EJS + Tailwind CSS.

Base de données : MongoDB.

CI/CD : GitHub Actions.

Infrastructure Requise

Nom de domaine, certificat SSL, bande passante flexible.

Compatibilité

Multinavigateurs (Chrome, Firefox, Safari).

Risques Techniques

Délais dus à la courbe d'apprentissage de certaines technos.

Intégration de fonctionnalités complexes.

Solutions Potentielles

Adoption de frameworks éprouvés.

Architecture modulaire.

Automatisation des tests et du déploiement.

4. Faisabilité Économique

Estimation des Coûts

Développement :

Développeurs (2) : 6 000 €/mois x 3 mois = 18 000 €

UI/UX Designer : 4 000 €

Infrastructure :

Hébergement + nom de domaine : 300 €/an

Maintenance : 1 000 €/an

Marketing : 2 000 €

Total estimé : environ 25 000 €

Analyse des Bénéfices Potentiels

Quantitatifs :

Réduction des coûts de production papier.

Monétisation possible via abonnements/pubs.

Qualitatifs :

Image innovante.

Accessibilité permanente (cloud).

Sources de Financement

Fonds propres

Subventions à l'innovation digitale

Partenariats potentiels

5. Faisabilité Opérationnelle

Ressources Humaines

- Chef de Projet
- Développeur Frontend & Backend
- Designer UI/UX
- Rédacteur de contenu (si articles)
- Community Manager (optionnel)

Processus de Développement

- Méthodologie Agile (Scrum)
- Outils : GitHub, Notion, Figma, Slack

Impact sur les Opérations Actuelles

Aucun impact direct sur des opérations existantes, étant un projet autonome.

6. Faisabilité Légale et Réglementaire

Protection des Données

Respect du RGPD : collecte minimale, consentement explicite, droit à l’effacement.

Droits d’Auteur

Utilisation de contenus libres de droit ou création originale.

Mentions Légales

Rédaction obligatoire d’une page “Mentions légales” et “Politique de confidentialité”.

7. Analyse SWOT

Forces	Faiblesses
Équipe motivée et compétente	Budget limité
Flexibilité technologique	Inexpérience en marketing digital
Opportunités	Menaces
Marché du bien-être et de l’organisation en plein essor	Concurrence accrue
Tendance du no-code/productivité personnalisée	Évolution rapide des technologies web

8. Recommandations et Conclusion

L’étude conclut que le projet est **faisable** sous conditions :
D’une équipe restreinte mais qualifiée,

D'une gestion agile rigoureuse,
D'un budget maîtrisé et potentiellement cofinancé.

III. Charte de Projet

1. Titre du Projet :Création d'un Bullet Journal Web

2. Date :Du 01/07/2025 Au 1 septembre2026

3. Sponsor du Projet:

Nom et prenom:Boumail melissa
Email:bmlmellissa34@gmail.com
Numéro de téléphone:0676823342

4. Chef de Projet

Nom et prenom:Massaid safia
Email:massaidsafia2@gmail.com
Numéro de téléphone:0676727042

5. But du Projet

- Fournir une plateforme numérique moderne et accessible permettant la publication régulière d'un bulletin journal en ligne.
- Renforcer la portée, l'interactivité et l'engagement des lecteurs tout en rationalisant les processus de publication internes.

6. Objectifs du Projet (SMART)

- **Spécifique** : Développer une plateforme web intégrant les modules suivants : Dashboard, Journal, Objectif, Calendrier, Rétrospective, Progression, Settings, Logout, ainsi qu'un CMS sécurisé.
- **Mesurable** : Lancer la plateforme au plus tard le 1 septembre 2026. Objectif de 300 lecteurs uniques mensuels dans les 3 mois suivant le lancement.
- **Atteignable** : L'équipe dispose des compétences requises et les outils nécessaires sont disponibles ou prévus.
- **Réaliste** : Le périmètre du projet est en adéquation avec le budget et le calendrier définis.
- **Temporellement Défini** : Livraison attendue pour le 1 juillet 2026.

7. Portée du Projet (Scope)

Inclusions

- Conception et développement d'une interface utilisateur complète.
- Mise en œuvre d'un système de gestion de contenu (CMS).
- Fonctions de recherche, de filtrage et de catégorisation des articles.
- Système d'authentification pour les utilisateurs (admin, rédacteurs).
- Phase complète de tests (fonctionnels, sécurité, performance).
- Déploiement initial et documentation.

Exclusions

- Application mobile native dédiée.
- Intégration de fonctionnalités avancées de monétisation.
- Intégration à des systèmes externes complexes (ERP, CRM).
- Migration de contenu historique publié avant [Date].

8. Principaux Livrables

- Application web fonctionnelle (frontend + backend)
- CMS documenté et opérationnel
- Code source commenté et versionné
- Documentation utilisateur (administrateurs/rédacteurs)
- Documentation technique (maintenance, sécurité, déploiement)
- Rapport de tests et PV de recette

9. Parties Prenantes Clés

- **Sponsor du Projet**
- **Chef de Projet**
- **Équipe de Développement** (Front-end, Back-end, DevOps)
- **Designer UI/UX**
- **Équipe de Rédaction** (utilisateurs du CMS)
- **Département IT** (infrastructure et sécurité)
- **Utilisateurs pilotes** (optionnels, pour retours ciblés)

10. Budget Estimé :environ 25 000 €

11. Jalons Principaux (Milestones)

Jalon	Date Prévue
Étude du projet	1 juin 2025
Validation de la Conception UI/UX	29 juin 2025
Fin du Développement Front-end	1 janvier2026
Fin du Développement Back-end	1 juin 2026
Tests & Recette	30 juillet 2026
Lancement Officiel	1 septembre 2026

12. Risques Initiaux Identifiés

Retards liés à des obstacles techniques imprévus

Dérive du périmètre fonctionnel (scope creep)

Difficulté d'intégration avec l'infrastructure existante

Manque ponctuel de ressources humaines qualifiées

13. Autorité et Responsabilités du Chef de Projet

Autorité pour gérer les ressources, le planning, et le périmètre fonctionnel du projet

Responsabilité de la communication continue avec le sponsor et les parties prenantes

Toute décision impactant de manière significative le budget, les délais ou le périmètre doit être validée par le sponsor

14. Critères de Succès du Projet

Livraison dans le respect du calendrier (avec tolérance maximale de 20 jours)

Respect du budget alloué (écart toléré de 15%)

Implémentation complète des modules UI/UX définis

Fonctionnement autonome du CMS pour l'équipe de rédaction

Plateforme stable, performante et conforme aux exigences de sécurité

IV. Matrice RACI


La matrice RACI est un outil essentiel pour définir les rôles et les responsabilités de chaque acteur dans un projet. Elle permet de s'assurer que pour chaque tâche ou livrable, il y a une clarté sur qui est **Responsable**, **Approuve**, est **Consulté**, et doit être **Informé**.

Rôles typiques du projet :

- Chef de Projet (CP)**
- Développeur Front-end (Dev FE)**
- Développeur Back-end (Dev BE)**
- Administrateur Système / DevOps (Admin/DevOps)**
- Rédacteur / Responsable Contenu (Rédacteur/RC)**
- Testeur / QA (QA)**
- Sponsor / Décideur (Sponsor)**

Responsabilités des Équipes

Distribution des tâches où chaque équipe est "Responsable" (RACI), assurant une claire attribution des rôles.

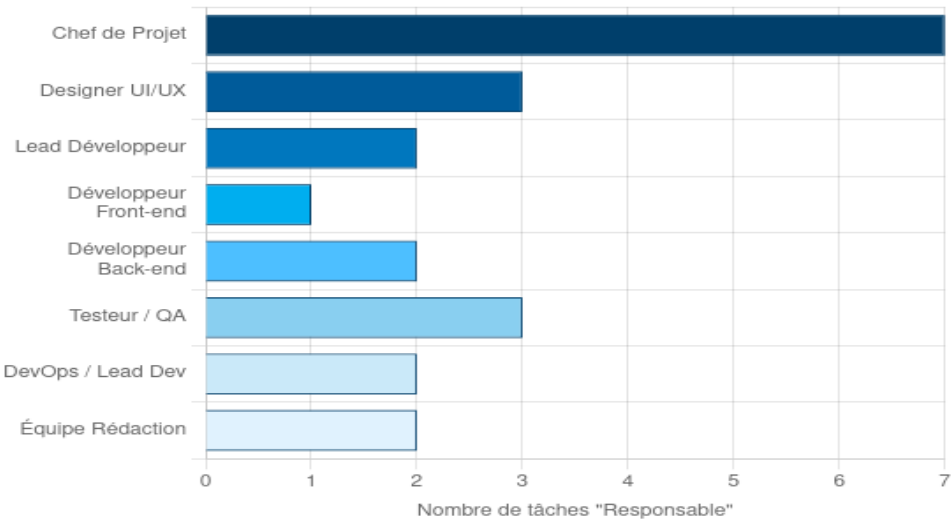

responsabilités pour chaque tâche ou livrable du projet.

Tâche/Livrable	Responsable (R)	Redevable (A)	Consulté (C)	Informé (I)
Établir le Project Charter	Chef de Projet	Sponsor	Lead Dev, Designer	Toutes les parties prenantes
Planifier le Projet	Chef de Projet	Chef de Projet	Équipe de développement	Sponsor, Équipe Rédaction
Suivi du Calendrier	Chef de Projet	Chef de Projet	Lead Dev	Sponsor, Équipe Rédaction
Gestion du Budget	Chef de Projet	Chef de Projet	Comptabilité	Sponsor
Suivi des Risques	Chef de Projet	Chef de Projet	Lead Dev, Sponsor	Toutes les parties prenantes

Rapports d'Avancement	Chef de Projet	Chef de Projet	-	Sponsor, Équipe
Conception UI/UX				
Recueil des Besoins UI/UX	Designer UI/UX	Chef de Projet	Équipe Rédaction, Lead Dev	Sponsor
Conception Maquettes	Designer UI/UX	Chef de Projet	Équipe de développement	Sponsor
Tests d'Usabilité	Designer UI/UX	Chef de Projet	Utilisateurs finaux testeurs	Équipe de développement, Sponsor
Validation UI/UX	Designer UI/UX	Chef de Projet	Sponsor, Équipe Rédaction	Équipe de développement
Développement				
Définition Architecture	Lead Développeur	Chef de Projet	Développeurs	Sponsor
Développement Front-end	Développeur Front-end	Lead Développeur	Designer UI/UX	Chef de Projet
Développement Back-end	Développeur Back-end	Lead Développeur	-	Chef de Projet
Intégration API	Développeur Back-end, Front-end	Lead Développeur	-	Chef de Projet
Développement CMS	Développeur Back-end	Lead Développeur	Équipe Rédaction	Chef de Projet
Tests & QA				
Rédaction Cas de Test	Testeur / QA	Chef de Projet	Lead Développeur	
Exécution des Tests	Testeur / QA	Chef de Projet	Développeurs	Sponsor
Suivi des Anomalies	Testeur / QA	Lead Développeur	Développeurs	Chef de Projet
Recette Utilisateur (UAT)	Équipe Rédaction	Chef de Projet	Testeur / QA, Lead Dev	Sponsor
Déploiement & Ops				
Configuration Environnement	DevOps / Lead Dev	Chef de Projet	-	Sponsor
Mise en Production	DevOps / Lead Dev	Chef de Projet	-	Toutes les parties prenantes

Maintenance & Support	DevOps / Lead Dev	Chef de Projet	-	Utilisateurs finaux
Contenu & Rédaction				
Création Contenu Initial	Équipe Rédaction	Responsable Rédaction	Designer UI/UX	Chef de Projet
Formation Utilisation CMS	Chef de Projet / Lead Dev	Chef de Projet	Équipe Rédaction	-

Légende RACI :

R - Responsable (Réalisateur) : La personne qui effectue la tâche. C'est elle qui fait le travail. (Il ne devrait y avoir qu'une seule personne "R" par tâche pour éviter la confusion).

A - Accountable (Approbateur) : La personne qui est en dernier ressort responsable de l'achèvement correct et complet de la tâche ou du livrable. Elle approuve le travail effectué par le "R". (Il ne doit y avoir qu'une seule personne "A" par tâche).

C - Consulted (Consulté) : Les personnes dont l'avis est sollicité avant qu'une décision ou une action ne soit prise. La communication est bidirectionnelle.

I- Informed (Informé) : Les personnes qui doivent être tenues informées des progrès ou des décisions. La communication est unidirectionnelle.

V. Énoncé de Portée (Scope Statement)

1. Livrables du Projet

1 Module Dashboard

Visualisation synthétique des statistiques clés : nombre d'articles publiés, vues, utilisateurs actifs.

Raccourcis vers les modules les plus utilisés.

Notifications récentes et aperçu des activités en cours.

2 Module Journal

Consultation des articles par date, auteur ou catégorie.

Moteur de recherche avancée.

Interface de création/édition/suppression pour les rédacteurs.

Support multimédia (texte, image, vidéo intégrée).

3 Module Objectif

Suivi des objectifs éditoriaux (ex. nombre d'articles/semaine).

Indicateurs de progression visuelle (barres, graphiques).

3.4 Module Calendrier

Planification des publications dans un calendrier éditorial.

Gestion des événements et échéances rédactionnelles.

5 Module Rétrospective

Espace dédié à la documentation des retours d'expérience.

Historique des décisions prises, points d'amélioration et apprentissages.

6 Module Progression

Suivi des tâches en cours.

Statut de progression du projet et de chaque contribution individuelle.

7 Module Settings

Gestion des utilisateurs (rôles, droits d'accès).

Paramètres de personnalisation (thèmes, alertes, préférences).

Configuration système (SEO, intégrations tierces simples).

8 Module Logout

Déconnexion sécurisée des sessions utilisateurs.

9 Back-end et Base de Données

Architecture RESTful pour communication front/back.

Modèle de base de données structuré (articles, utilisateurs, catégories, etc.).

Authentification et autorisation via JWT ou OAuth sécurisé.

10 Documentation

Manuel d'utilisation à destination des administrateurs et rédacteurs.

Documentation technique pour la maintenance et les évolutions futures.

2. Critères d'Acceptation

L'ensemble des fonctionnalités spécifiées dans les maquettes UI/UX est implémenté.

Taux de réussite de 100 % sur les tests fonctionnels et de régression.

Temps de chargement < 2 secondes sur 95 % des pages.

Score d'usabilité validé via tests utilisateurs (note $\geq 4/5$).

La plateforme satisfait aux standards de sécurité définis (audit conforme si applicable).

3. Hypothèses

Accès fluide aux parties prenantes pour la validation des besoins.

Outils et technologies nécessaires disponibles sans délai majeur.

Le budget reste constant sauf modification approuvée du périmètre.

L’infrastructure d’hébergement est prête et conforme aux exigences techniques.

4. Contraintes

- Budget :** Dépassement limité à 15 % maximum.
- Calendrier :** Date de lancement cible impérative : 1 septembre 2026.
- Ressources :** Équipe de développement limitée à 10 membres.
- Technologies imposées :** Conformité avec l’infrastructure IT actuelle.
- Sécurité :** Respect strict des politiques internes de cybersécurité.

VI. Plan de Communication

Ce plan détaille comment et quand les informations seront échangées entre les parties prenantes du projet.

1. Objectifs du Plan de Communication :

- Assurer que toutes les parties prenantes reçoivent les informations pertinentes au bon moment.
- Maintenir la transparence et la compréhension des objectifs, du statut et des défis du projet.
- Faciliter la prise de décision et la résolution des problèmes.
- Gérer les attentes des parties prenantes.

2. Parties Prenantes et Leurs Besoins en Information :

Partie Prenante	Besoins en Information
Sponsor du Projet	Avancement global, risques majeurs, décisions stratégiques, budget, bénéfices.
Chef de Projet	Tout sur le projet : avancement détaillé, problèmes, risques, budget, ressources, qualité.
Équipe de Développement	Tâches assignées, spécifications techniques, anomalies, retours UI/UX.
Designer UI/UX	Retours sur les maquettes, spécifications fonctionnelles, contraintes techniques.
Équipe de Rédaction	Fonctionnalités du CMS, dates de publication, formation à l'utilisation, retours utilisateurs.

Département IT	Exigences techniques d'infrastructure, sécurité, déploiement, maintenance.
Utilisateurs Finaux	Annonces de lancement, nouvelles fonctionnalités, guides d'utilisation, informations sur le contenu.

3. Contenu de la Communication :

Rapports d'avancement du projet (hebdomadaires, mensuels).

Ordres du jour et comptes-rendus de réunion.

Alertes de risques et plans d'action.

Décisions prises et justifications.

Mises à jour des documents clés (Charte, Scope, Calendrier).

Annonces de fonctionnalités ou de lancement.

Documentation technique et utilisateur.

4. Méthodes et Fréquences de Communication :

Type de Communication	Fréquence	Public Cible	Méthode	Responsable
Réunion de Démarrage	Une fois	Toutes parties prenantes	Réunion physique/virtuelle	Chef de Projet
Daily Scrum Meeting	Quotidienne	Équipe de développement	Stand-up meeting (15 min)	Lead Développeur
Réunion de Suivi Hebdo	Hebdomadaire	Équipe de développement, Designer, Chef de Projet	Réunion virtuelle/physique	Chef de Projet
Comité de Pilotage	Mensuelle	Sponsor, Chef de Projet, Managers IT/Rédaction	Réunion virtuelle/physique	Chef de Projet
Rapport d'Avancement	Mensuelle	Sponsor, Parties Prenantes clés	E-mail avec rapport PDF/outil projet	Chef de Projet
Notification de Risques	Ad hoc	Parties prenantes concernées	E-mail / Appel téléphonique	Chef de Projet
Mises à Jour du CMS	Selon besoin	Équipe de Rédaction	Session de formation / Note d'information	Lead Développeur

Annonces de Lancement	Ponctuelle	Utilisateurs finaux	Site web, e-mail, réseaux sociaux	Responsable Com. / Chef de Projet
Réunion de Clôture	Une fois	Toutes parties prenantes	Réunion physique/virtuelle	Chef de Projet

5. Outils de Communication :

Gestion de Projet : Jira.

Communication Synchrone : Slack, Google Meet .

Communication Asynchrone : E-mail (pour les communications formelles et les rapports), Confluence/Wiki (pour la documentation partagée).

Partage de Fichiers : Google Drive.

VII. Budget Table (Tableau Budgétaire)

Un tableau détaillant les coûts estimés pour chaque poste de dépense du projet.

Catégorie de Dépense	Description Détaillée	Coût Estimé (HT)	Notes / Hypothèses
1. Ressources Humaines			Base : 2 Développeurs sur 3 mois, 1 Designer.
Développement			
Développeurs (2 personnes)	Salaire/Prestation : 6 000 €/mois x 3 mois	18000	Inclut Dev Front-end et Dev Back-end (coût moyen par personne 3 000 €/mois HT). Cœur du budget.
UI/UX Designer	Prestation forfaitaire ou allocation de temps	4000	Conception des maquettes et prototypes. Peut être un freelance dédié pour la durée nécessaire.
(Chef de Projet)	(Inclus dans la gestion globale du projet ou dans les "Développeurs")	0	Pour rester dans le budget, le rôle de Chef de Projet est soit endossé par un des développeurs, soit non facturé séparément.
(Testeurs / QA)	(Inclus dans les "Développeurs")	0	Les tests sont supposés être effectués par les développeurs eux-mêmes (tests unitaires, d'intégration) ou par un "super-utilisateur" interne.
Sous-total Ressources Humaines		22000	
2. Logiciels & Licences			Priorité aux solutions gratuites/open source pour optimiser le budget.
Outil de Gestion de Projet	Abonnement annuel (ex: Trello, Asana - plan gratuit)	0	Utilisation de la version gratuite, suffisante pour une petite équipe.
Logiciels de Design	Licences (ex: Figma Free,	0	Utilisation de versions gratuites ou

	GIMP, ou équivalents)		alternatives open source.
Base de Données	Licences (ex: PostgreSQL, MySQL - Open Source)	0	Utilisation de bases de données open source, pas de coût de licence directe.
Outils de Développement	Licences IDE, outils de déploiement (VS Code, Git)	0	Utilisation d'outils de développement gratuits.
Sous-total Logiciels & Licences		0	
3. Infrastructure & Services			Vos estimations annuelles sont réparties sur la durée du projet ou incluses dans le coût initial.
Hébergement Cloud	Coût annuel (selon votre base)	300	Serveur web et base de données. Il s'agit d'un coût annuel qui sera amorti sur la durée de vie du projet.
Nom de Domaine	Coût annuel (généralement inclus dans l'hébergement ou minime)	0	Généralement un petit coût annuel (~15-20€), souvent inclus dans le forfait d'hébergement ou jugé négligeable ici.
Certificat SSL	Coût annuel (via Let's Encrypt - gratuit)	0	Sécurisation HTTPS gratuite et essentielle.
Sous-total Infrastructure & Services		300	
4. Maintenance (Annuelle)	Coût annuel de la maintenance corrective et évolutive	1000	Ce budget est pour la première année post-lancement. Il couvre les correctifs et petites évolutions.
Sous-total Maintenance		1000	
5. Marketing & Lancement	Campagne de lancement	2000	Budget pour des actions ciblées : publicités ciblées, promotion sur les réseaux sociaux, petite campagne de RP.
Sous-total Marketing		2000	
6. Contingence (Imprévus)	10% du Coût Total des postes alloués	1700	Provision pour couvrir les risques non identifiés, les dépassements de temps ou les imprévus (10% de 18000+4000 = 22000).
TOTAL GÉNÉRAL ESTIMÉ		25000	Ce montant est une estimation très serrée. Un suivi budgétaire rigoureux est indispensable.

Résumé et Points Clés du Budget :

Ressources Humaines : Elles représentent la majeure partie de votre budget (22 000 € sur 25 000 €). Cela signifie que l'efficacité et la productivité de l'équipe de développement et du designer seront **critiques**.


- Le Chef de Projet et les Testeurs / QA ne sont pas facturés séparément, impliquant que leurs rôles sont soit assurés par les développeurs/designer, soit par des ressources internes déjà rémunérées pour d'autres fonctions.

Contraintes Fortes : Ce budget est très contraint pour un projet de développement web complet. Il implique de minimiser les coûts sur tous les autres postes.

Maintenance : Le budget de 1 000 € pour la maintenance annuelle est un bon début, mais il faudra surveiller attentivement ce poste après le lancement.

Marketing : Les 2 000 € permettent une petite campagne ciblée, mais ne couvriront pas une stratégie marketing agressive.

Zéro Coût Logiciel : L'accent est mis sur l'utilisation de solutions open source et gratuites pour maintenir les coûts bas.

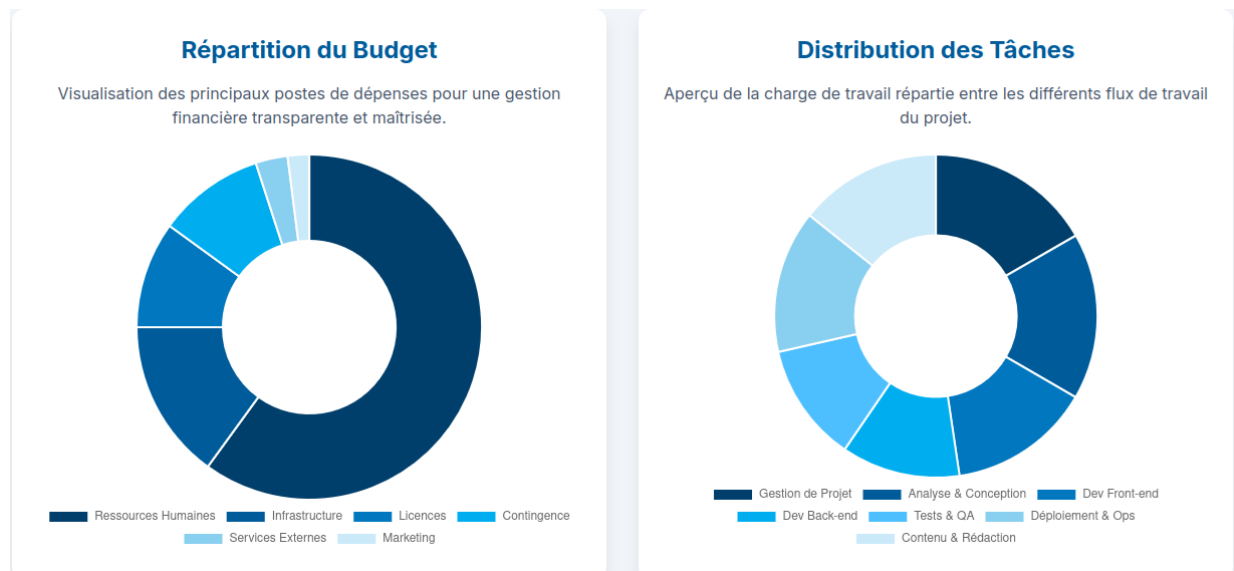

VIII. Liste des taches

Tâches à inclure, structurées par Phase :

✓ Phase 1 : Initialisation

T1 : Rédaction et Validation Étude de Faisabilité

T2 : Rédaction et Approbation Project Charter

T3 : Identification et Engagement des Parties Prenantes

✓ Phase 2 : Planification

T4 : Détail des Spécifications Fonctionnelles et Techniques

T5 : Définition de l'Architecture Technique

T6 : Planification Détaillée du Budget et des Ressources

T7 : Création et Validation Matrice RACI

T8 : Établissement du Plan de Communication

T9 : Établissement du Plan de Disponibilité

T10 : Établissement du Journal des Risques (Risk Log)

✓ Phase 3 : Exécution (Itérative)

3.1. Conception UI/UX :

- T11 : Conception Maquettes Dashboard

- T12 : Conception Maquettes Journal
- T13 : Conception Maquettes Objectif, Calendrier, Rétrospective, Progression
- T14 : Conception Maquettes Settings & Logout
- T15 : Prototypage et Tests d'Usabilité

3.2. Développement Front-end :

- T16 : Développement Module Dashboard
- T17 : Développement Module Journal (Vue Lecteur)
- T18 : Développement Modules Objectif, Calendrier, Rétrospective, Progression
- T19 : Développement Module Settings & Logout
- T20 : Intégration Front-end / Back-end

3.3. Développement Back-end & CMS :

- T21 : Mise en place Base de Données
- T22 : Développement API de Gestion des Articles
- T23 : Développement API de Gestion des Utilisateurs et Rôles
- T24 : Développement Logique Métier CMS
- T25 : Système d'Authentification et d'Autorisation

3.4. Tests & Assurance Qualité :

- T26 : Rédaction des Cas de Test
- T27 : Exécution des Tests Unitaires et d'Intégration
- T28 : Exécution des Tests Fonctionnels
- T29 : Exécution des Tests de Performance et de Sécurité
- T30 : Phase de Recette Utilisateur (UAT)

3.5. Déploiement :

- T31 : Configuration de l'Environnement de Production
- T32 : Mise en Production Initiale

✓ Phase 4 : Clôture

T33 : Bilan du Projet et Leçons Apprises

T34 : Rédaction Documentation Finale (Utilisateur et Technique)

T35 : Transfert de Connaissances

Vue d'Ensemble de la phase deux

✓ Module Dashboard

Description : Vue d'ensemble des statistiques, activités et raccourcis.

Durée Estimée : 15 Jours-Homme

Points Clés : Statistiques, notifications, accès rapide.

✓ Module Journal

Description : Affichage, recherche, édition d'articles, support multi-formats.

Durée Estimée : 40 Jours-Homme

Points Clés : Publication, recherche avancée, édition, médias.

✓ Module Objectif

Description : Suivi et visualisation des objectifs éditoriaux.

Durée Estimée : 10 Jours-Homme

Points Clés : Suivi, avancement, objectifs.

✓ Module Calendrier

Description : Planification des publications et gestion des échéances.

Durée Estimée : 15 Jours-Homme

Points Clés : Planification, événements, échéances.

✓ Module Rétrospective

Description : Documentation des leçons apprises et points d'amélioration.

Durée Estimée : 10 Jours-Homme

Points Clés : Leçons apprises, amélioration.

✓ Module Progression

Description : Visualisation de l'avancement global du projet et des tâches.

Durée Estimée : 10 Jours-Homme

Points Clés : Avancement global, suivi tâches.

✓ Module Settings

Description : Gestion des utilisateurs, rôles et préférences du site.

Durée Estimée : 25 Jours-Homme

Points Clés : Utilisateurs, rôles, configuration, SEO.

✓ **Module Logout**

Description : Déconnexion sécurisée.

Durée Estimée : 2 Jours-Homme

Points Clés : Sécurité, déconnexion.

✓ **Back-end et Base de Données**

Description : API, BDD, authentification robuste.

Durée Estimée : 50 Jours-Homme

Points Clés : API RESTful, BDD structurée, Authentification/Autorisation.

✓ **Documentation**

Description : Manuels utilisateur et technique.

Durée Estimée : 20 Jours-Homme

Points Clés : Manuel utilisateur, documentation technique.

Total Estimé du Projet : **Environ 320 Jours**

X. Milestone Table (Table des Jalons)


Les jalons sont des points importants dans le calendrier du projet, représentant l'achèvement d'une phase majeure ou d'un livrable clé.

Jalon #	Nom du Jalon	Date Cible	Livrables Associés	Signification
1	Approbation du Project Charter	28 juin 2025	Project Charter signé et validé par le Sponsor	Autorisation officielle pour démarrer le projet
2	Validation Conception UI/UX	31 décembre 2025	Maquettes UI/UX et prototypes validés pour tous les modules (Dashboard, Journal, etc.)	La vision de l'interface utilisateur est figée et approuvée
3	Fin du Développement Front-end	31 mai 2026	Toutes les interfaces utilisateur développées et intégrées, sans le back-end final	Les écrans sont interactifs et prêts à être connectés aux APIs
4	Fin du Développement Back-end	29 juillet 2026	Toutes les APIs et la logique métier du CMS sont opérationnelles	Le cœur fonctionnel du système est prêt à interagir avec le front-end
5	Fin des Tests et Recette	9 août 2026	Rapports de tests validés, toutes les anomalies majeures corrigées, validation de la Recette Utilisateur	Le système est jugé stable, fonctionnel et répond aux attentes des utilisateurs

6	Lancement du Bulletin Web	30 août 2026	Mise en production du bulletin journal web accessible au public	Le produit est officiellement lancé et disponible aux lecteurs
7	Clôture du Projet	1 septembre 2026	Documentation finale livrée, bilan du projet réalisé, équipe démobilisée	Fin officielle de la phase de développement du projet

XI.Diagramme Gant global:

ID Tâche	Nom de la Tâche	Durée (Jours-Homme)	Dépendances (ID Tâche)
T1	Back-end et Base de Données	50	Aucune
T2	Dashboard	15	T1 (début)
T3	Journal	40	T1 (début)
T4	Objectif	10	T1 (début)
T5	Calendrier	15	T1 (début)
T6	Rétrospective	10	T1 (début)
T7	Progression	10	T1 (début)
T8	Settings	25	T1 (fin)
T9	Logout	2	T8
T10	Documentation	20	T1 (début)

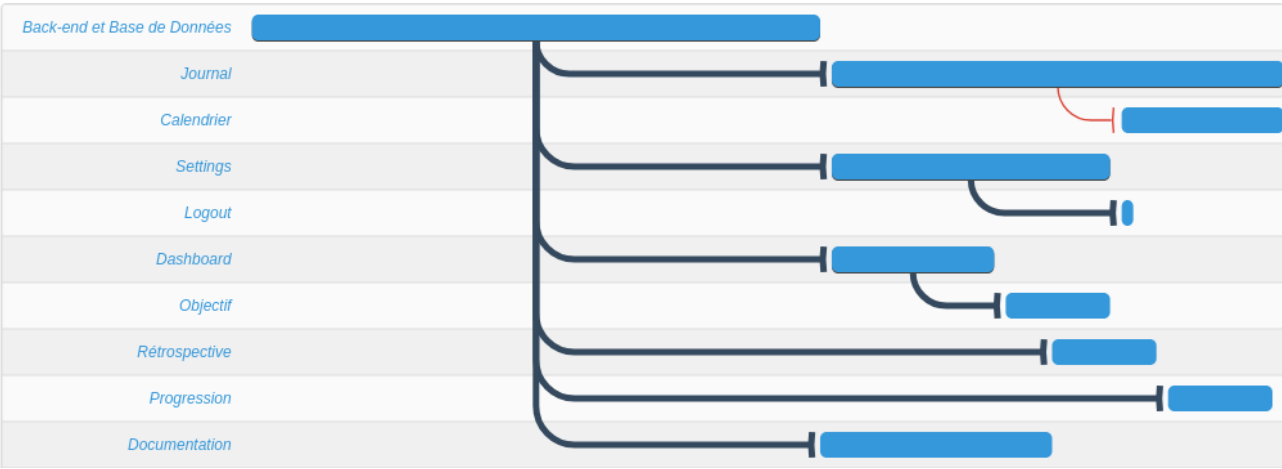

XII. Risk Log (Journal des Risques)

Le journal des risques est un document qui identifie, analyse, planifie la réponse et suit les risques du projet.

ID Risque	Description du Risque	Catégorie du Risque	Probabilité (Faible/Moyenne/Élevée)	Impact (Faible/Moyen/Élevé)	Score Risque (P x I)	Plan d'Atténuation / Réponse	Responsable	Statut (Ouvert/Fermé)
R01	Retard dans la livraison des fonctionnalités clés	Calendrier	Moyenne	Élevé	Moyen	Atténuation : Priorisation stricte des fonctionnalités, allocation de ressources supplémentaires si nécessaire, utilisation de méthodologies agiles pour des livraisons fréquentes. Contingence : Réduire la portée des fonctionnalités non critiques.	Chef de Projet	Ouvert
R02	Dérive du budget due à des imprévus techniques	Coût	Moyenne	Élevé	Moyen	Atténuation : Inclure une provision pour imprévus (contingence), suivi budgétaire strict et régulier, approbation formelle de toute modification de portée impactant le budget.	Chef de Projet	Ouvert
R03	Manque d'expertise technique sur une technologie	Ressources	Faible	Moyen	Faible	Atténuation : Plan de formation rapide pour l'équipe, recrutement de compétences externes si besoin, consultation d'experts. Contingence : Adapter l'architecture pour utiliser des technologies maîtrisées si l'expertise manque.	Chef de Projet	Ouvert

	e donnée							
R04	Problèmes de sécurité (cyberattaque, fuite de données)	Sécurité	Moyenne	Élevé	Moyen	Atténuation : Réalisation d'audits de sécurité réguliers, tests de pénétration, mise en place de protocoles de sécurité robustes, sensibilisation de l'équipe. Contingence : Plan de reprise après sinistre, assurance cyber-risque.	Lead Dev / Ops	Ouvert
R05	Non-adoption de la plateforme par les utilisateurs finaux (lecteurs / rédacteurs)	Opérationnel	Faible	Moyen	Faible	Atténuation : Impliquer les utilisateurs clés dans la conception (UX), offrir des sessions de formation claires pour les rédacteurs, recueillir et agir sur les retours utilisateurs après le lancement.	Chef de Projet	Ouvert
R06	Changement fréquent des exigences (Scope Creep)	Portée	Moyenne	Élevé	Moyen	Atténuation : Processus strict de gestion des changements (Change Request), communication claire sur la portée initiale du projet, priorisation rigoureuse des fonctionnalités.	Chef de Projet	Ouvert
R07	Défaillance de l'infrastructure d'hébergement	Technique / Ops	Faible	Élevé	Moyen	Atténuation : Utilisation d'un hébergement cloud avec redondance et haute disponibilité, plan de reprise d'activité (PRA) documenté et testé.	DevOps / Lead Dev	Ouvert
R08	Performance insuffisante du site (lenteur)	Technique	Faible	Moyen	Faible	Atténuation : Optimisation du code et des requêtes SQL, utilisation de CDN, tests de charge réguliers. Contingence : Mise à l'échelle des ressources serveurs.	Lead Dev	Ouvert

XIII. Work Streams (Flux de Travail)

Les *Work Streams* désignent des ensembles cohérents d'activités regroupées par domaine fonctionnel ou par responsabilité d'équipe. Ils permettent une organisation claire, une répartition efficace des tâches et une meilleure coordination entre les parties prenantes du projet.

1. Gestion de Projet

Description : Pilotage global du projet incluant la planification, le suivi, le contrôle, et la clôture.

Activités Clés :

Élaboration et mise à jour des livrables de gestion (Charte, Plan de Communication, Plan de Disponibilité, Budget, Registre des Risques).

Planification des tâches, ressources et jalons.

Organisation des instances de suivi (réunions quotidiennes, hebdomadaires, comités de pilotage).

Suivi de la performance (avancement, budget, périmètre).

Gestion des risques, des incidents et de la communication avec les parties prenantes.

Reporting régulier au Sponsor et à la Direction.

Clôture du projet avec formalisation des retours d'expérience.

Responsable Principal : Chef de Projet.

2. Analyse & Conception (UI/UX)

Description : Définition des besoins et conception de l'expérience utilisateur et de l'interface.

Activités Clés :

Recueil des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

Analyse des parcours utilisateurs (*user flows*).

Conception de wireframes et maquettes graphiques (UI).

Réalisation de prototypes interactifs.

Tests d'utilisabilité avec échantillons utilisateurs.

Documentation des spécifications UI/UX.

Responsable Principal : Designer UI/UX.

3. Développement Front-end

Description : Développement de l'interface utilisateur visible et interactive.

Activités Clés :

Intégration des maquettes via HTML/CSS (Tailwind) et JavaScript (React ou autre).

Création des composants interactifs par module.

Connexion aux APIs Back-end.

Adaptation responsive (mobile, tablette, desktop).

Optimisation des performances.

Réalisation des tests unitaires et d'intégration.

Responsable Principal : Lead Développeur Front-end.

4. Développement Back-end & Base de Données

Description : Développement de la logique métier, des services et de la couche données.

Activités Clés :

Conception de l'architecture technique.

Modélisation de la base de données (utilisateurs, articles, modules...).

Développement des APIs RESTful (CRUD, authentification, autorisation).

Implémentation des fonctionnalités métiers (statistiques, plannings...).

Sécurisation de l'application.

Tests unitaires et d'intégration des services.

Responsable Principal : Lead Développeur Back-end.

5. Tests & Assurance Qualité (QA)

Description : Vérification de la conformité fonctionnelle et technique du système.

Activités Clés :

Élaboration des plans et cas de tests.

Tests fonctionnels module par module.

Tests d'intégration entre Front-end et Back-end.

Tests de performance, de sécurité et de robustesse.

Suivi des anomalies et collaboration avec les équipes de développement.

Coordination de la Recette Utilisateur (UAT).

Responsable Principal : QA Engineer / Testeur.

6. Déploiement & Opérations (DevOps)

Description : Mise en œuvre, automatisation et supervision des environnements techniques.

Activités Clés :

Configuration des environnements (dev/test/prod).

Mise en place des pipelines CI/CD.

Supervision de l'infrastructure (serveurs, bases, réseaux).

Surveillance de la disponibilité et des performances.

Sauvegarde et restauration des données.

Implémentation du Plan de Continuité et de Reprise (PCA/PRA).

Gestion des mises à jour et des correctifs.

Responsable Principal : Ingénieur DevOps / Lead Développeur (en l'absence de DevOps dédié).

7. Contenu & Rédaction (Post-Développement Initial)

Description : Gestion du contenu éditorial du bulletin web.

Activités Clés :

Définition du calendrier éditorial.

Rédaction des articles et contenus multimédias.

Intégration via CMS.

Optimisation SEO.

Suivi des droits d'auteur et licences.

Analyse post-lancement des performances de consultation.
