

Étude de Faisabilité et Cadrage Projet

Plateforme de Coaching Linguistique en Ligne

Version : 1.0 | Date : 29 juin 2025

Rédigé par

Massaid Safia

Connecter les apprenants aux tuteurs, globalement.

Table des matières

1. Résumé Exécutif	3
2. Objectifs du Projet	3
2.1. Objectifs SMART	3
2.2. Objectifs Secondaires	4
3. Portée du Projet	4
3.1. Inclusions	4
3.2. Exclusions	5
4. Livrables du Projet	5
4.1. Livrables Principaux	5
5. Parties Prenantes	5
6. Structure Organisationnelle du Projet	5
7. Tableau des Tâches et Dates	6
8. Gestion des Risques	11
9. Budget du Projet	11
10. Plan de Communication	12
11. Plan de Qualité	13
12. Plan de Gestion des Changements	13
13. Plan de Clôture du Projet	13

1. Résumé Exécutif

Ce document esquisse la feuille de route complète pour la création et le lancement de notre **plateforme de coaching linguistique en ligne**. C'est un projet ambitieux, mais essentiel, visant à transformer la manière dont les individus apprennent et maîtrisent de nouvelles langues.

Notre objectif fondamental est de développer un **site web intuitif, robuste et riche en fonctionnalités**. Cette plateforme servira de pont numérique, connectant de manière fluide les apprenants désireux de perfectionner leurs compétences linguistiques avec un réseau de **tuteurs natifs et certifiés** à travers le monde. Nous voulons offrir une expérience d'apprentissage qui soit non seulement efficace, mais aussi incroyablement engageante et personnalisée.

Concrètement, la plateforme intégrera des **fonctionnalités clés** pour garantir une expérience utilisateur exceptionnelle :

- **Gestion des cours** : Une interface simple pour les tuteurs afin de créer et de gérer leurs offres de cours, et pour les apprenants de parcourir et de s'inscrire facilement.
- **Planification des sessions** : Un système de calendrier intégré et intuitif permettant aux apprenants de trouver et de réserver des sessions avec les tuteurs disponibles, et aux tuteurs de gérer leurs emplois du temps.
- **Suivi des progrès** : Des tableaux de bord personnalisés pour les apprenants afin de visualiser leurs réalisations, leurs points forts et les domaines à améliorer, et pour les tuteurs de suivre la progression de leurs élèves.
- **Messagerie intégrée** : Un canal de communication direct et sécurisé entre apprenants et tuteurs, facilitant les échanges avant, pendant et après les sessions.
- **Système de visioconférence sécurisé** : Pour des interactions fluides et en temps réel, répliquant l'expérience d'une salle de classe privée.
- **Gestion des paiements** : Un module de paiement intégré et fiable pour des transactions sécurisées et transparentes.

Ce projet représente bien plus qu'un simple développement technologique. C'est une opportunité de créer un **écosystème d'apprentissage dynamique** qui brise les barrières géographiques et temporelles, rendant l'acquisition des langues accessible et agréable pour tous. Nous sommes convaincus que cette plateforme deviendra un acteur majeur dans le domaine de l'éducation linguistique en ligne, générant une nouvelle source de revenus significative tout en améliorant l'engagement et la satisfaction de nos futurs utilisateurs.

2. Objectifs du Projet

2.1. Objectifs SMART

- **Spécifique** : Développer une plateforme web fonctionnelle permettant aux apprenants de trouver, réserver et suivre des sessions de coaching linguistique avec des tuteurs, et aux tuteurs de gérer leurs cours et leurs étudiants.
- **Mesurable** :

- Lancer une version MVP (Minimum Viable Product) de la plateforme dans les 6 mois.
- Atteindre 500 inscrits (250 apprenants et 250 tuteurs) dans les 3 mois suivant le lancement.
- Obtenir un taux de satisfaction utilisateur (apprenants et tuteurs) de 85% mesuré via des enquêtes post-session.
- Réduire le temps moyen de réservation d'une session à moins de 2 minutes.
- **Atteignable** : Avec une équipe dédiée et les ressources nécessaires (financières et techniques), les objectifs sont réalistes.
- **Réaliste** : Le marché du coaching linguistique en ligne est en pleine croissance, et une plateforme bien conçue peut répondre à un besoin réel.
- **Temporellement défini** : La phase de développement initiale (MVP) est fixée à 6 mois.

2.2. Objectifs Secondaires

- Faciliter l'accès à un coaching linguistique de qualité pour un large public.
- Offrir une source de revenus flexible pour les tuteurs qualifiés.
- Créer une communauté d'apprentissage et d'échange linguistique.
- Assurer la sécurité des données et la confidentialité des utilisateurs.

3. Portée du Projet

3.1. Inclusions

- **Site Web (Front-end) :**
 - Page d'accueil attrayante et informative.
 - Profils utilisateurs (apprenants et tuteurs) avec possibilité de personnalisation.
 - Moteur de recherche de tuteurs (par langue, niveau, spécialité, disponibilité, tarif, avis).
 - Page de détail du tuteur (biographie, langues enseignées, vidéos/audios de présentation, avis).
 - Système de réservation de sessions (calendrier interactif).
 - Interface de classe virtuelle intégrée (visioconférence).
 - Messagerie instantanée entre apprenants et tuteurs.
 - Tableau de bord utilisateur (historique des sessions, progrès, sessions à venir).
 - Système de paiement sécurisé.
 - Système d'avis et de notation.
 - FAQ et section d'aide.
- **Back-end (Administration et Gestion) :**
 - Base de données pour les utilisateurs, les cours, les sessions, les paiements, etc.
 - Système d'authentification et de gestion des rôles (admin, tuteur, apprenant).
 - Tableau de bord administrateur pour la gestion des utilisateurs, des contenus, des transactions.
 - Outils de suivi des performances de la plateforme.
 - Système de notification (e-mails, notifications in-app).
- **Fonctionnalités Spécifiques :**
 - **Gestion des cours** : Les tuteurs peuvent créer et gérer leurs offres de cours (langues, niveaux, thèmes).
 - **Planning des sessions** : Calendrier partagé permettant la prise de rendez-vous et la gestion des disponibilités des tuteurs.

- **Suivi des progrès** : Outils pour les tuteurs de noter les progrès de l'apprenant, et pour les apprenants de visualiser leur évolution.
- **Messagerie intégrée** : Communication directe et sécurisée entre les utilisateurs.

3.2. Exclusions

- Développement d'applications mobiles natives (iOS/Android) dans la phase MVP.
- Contenu pédagogique pré-enregistré ou cours structurés par la plateforme (initialement, ce sont les tuteurs qui définissent leurs cours).
- Fonctionnalités de gamification avancées.
- Intégration avec des outils d'évaluation linguistique externes dans la phase MVP.
- Service client 24/7 (initialement support par email/chat pendant les heures ouvrables).

4. Livrables du Projet

4.1. Livrables Principaux

- Document de spécifications fonctionnelles et techniques.
- Maquettes et prototypes UI/UX.
- Base de données conçue et optimisée.
- Code source de la plateforme (front-end et back-end).
- Environnement de test et rapports de test.
- Plateforme déployée et fonctionnelle en production.
- Documentation utilisateur (guide apprenant, guide tuteur).
- Manuel d'administration.
- Plan de communication et de marketing initial.

5. Parties Prenantes

- **Porteur de Projet / Sponsor** : La personne ou l'entité qui finance et supervise le projet.
- **Chef de Projet** : Responsable de la planification, de l'exécution et de la clôture du projet.
- **Équipe de Développement** : Développeurs front-end, back-end, bases de données.
- **Designer UI/UX** : Responsable de l'expérience utilisateur et de l'interface graphique.
- **Testeurs QA** : Assurent la qualité et le bon fonctionnement de la plateforme.
- **Experts Linguistiques / Tuteurs Potentiels** : Pour valider les besoins fonctionnels spécifiques au coaching linguistique.
- **Apprenants Potentiels** : Pour les tests utilisateurs et la validation des besoins.
- **Équipe Marketing/Communication** : Pour le lancement et la promotion de la plateforme.
- **Fournisseurs Tiers** : Solutions de paiement, hébergement, outils de visioconférence.

6. Structure Organisationnelle du Projet

- **Directeur de Projet / Sponsor**
 - **Chef de Projet**
 - Équipe de Développement (Frontend, Backend, DevOps)
 - Équipe UI/UX
 - Équipe QA (Qualité Assurance)
 - Consultants Externes (Linguistiques, Légal si nécessaire)
 - **Équipe Marketing & Communication**

7. Tableau des Tâches et Dates

Un aperçu clair des dates de début et de fin pour chaque tâche du projet, facilitant le suivi et la planification


ID	Nom de la Tâche / Jalon	Responsable	Date de Début Prévue	Date de Fin Prévue	Durée (jours ouvrés)	Dépendances (ID Prédecesseur)	% Complété	Notes / Livrables Clés
1.0	PHASE 1 : Conception & Spécifications	Chef de Projet	01/07/2025	31/07/2025	22		0	Spécifications fonctionnelles, maquettes UI/UX
01/01/2025	Étude de marché & Analyse des besoins	Analyste Fonctionnel	01/07/2025	12/07/2025	8		0	Rapport d'analyse des besoins
01/02/2025	Conception UX (Wireframes, Parcours)	Designer UI/UX	08/07/2025	22/07/2025	11	1.1 (FD)	0	Wireframes validés, user flows
01/03/2025	Conception UI (Maquettes Graphiques)	Designer UI/UX	15/07/2025	29/07/2025	11	1.2 (FD)	0	Maquettes haute fidélité
01/04/2025	Spécifications techniques détaillées	Architecte Technique	18/07/2025	31/07/2025	10	1.2 (FD), 1.3 (DD)	0	Document d'architecture, spéc. API
01/05/2025	Jalon : Validation Spécifications	Chef de Projet	31/07/2025	31/07/2025	0	1.4 (FD)	0	Approbation finale des spécifications
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.0	PHASE 2 : Développement Back-end	Tech Lead Back	01/08/2025	30/09/2025	44	1.5 (FD)	0	API fonctionnelles, BDD structurée
02/01/2025	Conception Base de Données	Développeur Back	01/08/2025	07/08/2025	5	1.5 (FD)	0	Schéma BDD validé
02/02/2025	Module Authentification & Profils	Développeur Back	08/08/2025	21/08/2025	10	2.1 (FD)	0	API Login/Inscription
02/03/2025	Module Gestion Cours & Tuteurs	Développeur Back	22/08/2025	11/09/2025	15	2.2 (FD)	0	API création/gestion cours/tuteurs
02/04/2025	Module Planification Sessions	Développeur Back	12/09/2025	25/09/2025	10	2.3 (FD)	0	API gestion des plannings


02/05/2025	Intégration Système de Paiement	Développeur Back	18/09/2025	30/09/2025	9	2.3 (DD)	0	Passerelle de paiement configurée
02/06/2025	Jalon : API Back-end Prêtes	Tech Lead Back	30/09/2025	30/09/2025	0	2.4 (FD), 2.5 (FD)	0	Back-end prêt pour le Front-end
---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.0	PHASE 3 : Développement Front-end	Tech Lead Front	15/08/2025	31/10/2025	50	1.5 (FD)	0	Interface utilisateur fonctionnelle
03/01/2025	Intégration Maquettes UI (Pages Statiques)	Développeur Front	15/08/2025	30/08/2025	12	1.3 (FD)	0	Pages HTML/CSS basiques
03/02/2025	Développement Interface Profils (Appr./Tut.)	Développeur Front	01/09/2025	14/09/2025	10	2.2 (DD), 3.1 (FD)	0	Interface Profils interactive
03/03/2025	Développement Moteur de Recherche Tuteurs	Développeur Front	15/09/2025	28/09/2025	10	2.3 (DD), 3.2 (FD)	0	Fonctionnalités de recherche
03/04/2025	Développement Système de Réservation	Développeur Front	29/09/2025	12/10/2025	10	2.4 (DD), 3.3 (FD)	0	Calendrier de réservation
03/05/2025	Intégration Visioconférence (Classe Virtuelle)	Développeur Front	06/10/2025	20/10/2025	10	2.6 (FD)	0	Salle de cours virtuelle
03/06/2025	Développement Messagerie Intégrée	Développeur Front	13/10/2025	27/10/2025	10	2.6 (DD), 3.4 (DD)	0	Système de chat
03/07/2025	Tableau de Bord & Suivi des Progrès	Développeur Front	21/10/2025	31/10/2025	8	3.5 (DD), 3.6 (DD)	0	Visualisation progrès
03/08/2025	Jalon : Front-end Fonctionnel (Alpha)	Tech Lead Front	31/10/2025	31/10/2025	0	3.7 (FD)	0	Interface utilisateur complète pour tests Alpha
---	---	---	---	---	---	---	---	---
4.0	PHASE 4 : Tests & Assurance Qualité (QA)	Chef de Projet	01/11/2025	20/11/2025	14	2.6 (FD), 3.8 (FD)	0	Plateforme Stable
04/01/2025	Tests Unitaires & d'Intégration	Développeurs	01/11/2025	07/11/2025	5	2.6 (DD), 3.8 (DD)	0	Rapports de tests unitaires
04/02/2025	Tests Système (Scénarios de bout en bout)	Testeur QA	04/11/2025	14/11/2025	9	4.1 (FD)	0	Rapports de tests système

04/03/2025	Tests d'Acceptation Utilisateur (UAT)	Testeur QA, Utilisateurs	10/11/2025	19/11/2025	8	4.2 (DD)	0	Retours utilisateurs, rapport UAT
04/04/2025	Corrections de Bugs et Optimisations	Équipe Dev	15/11/2025	20/11/2025	4	4.3 (FD)	0	Version stable du code
04/05/2025	Jalon : Plateforme Validée QA	Chef de Projet	20/11/2025	20/11/2025	0	4.4 (FD)	0	Plateforme prête pour le déploiement
---	---	---	---	---	---	---	---	---
5.0	PHASE 5 : Préparation Lancement & Marketing	Resp. Marketing	01/11/2025	10/12/2025	28	3.8 (FD)	0	Campagnes marketing prêtes
05/01/2025	Création Contenu Marketing (textes, visuels)	Copywriter, Designer	01/11/2025	15/11/2025	11		0	Matériel marketing
05/02/2025	Campagne de Recrutement Tuteurs (Pré-lancement)	Resp. Marketing	08/11/2025	29/11/2025	16		0	Base de données tuteurs potentiels
05/03/2025	Configuration Outils Analyse & SEO	Resp. Marketing	15/11/2025	25/11/2025	7	4.5 (DD)	0	Google Analytics, SEO On-page
05/04/2025	Plan de Communication Lancement	Resp. Marketing	26/11/2025	05/12/2025	7	5.1 (FD)	0	Communiqué de presse, posts sociaux
05/05/2025	Jalon : Préparation au Lancement Terminée	Resp. Marketing	10/12/2025	10/12/2025	0	5.4 (FD)	0%**	Prêt à activer le lancement
---	---	---	---	---	---	---	---	---
6.0	PHASE 6 : Déploiement & Lancement Public	Chef de Projet	16/12/2025	31/12/2025	12	4.5 (FD), 5.5 (FD)	0	Plateforme en ligne, utilisateurs actifs
06/01/2025	Déploiement en Production	Ingénieur DevOps	16/12/2025	17/12/2025	2	4.5 (FD)	0	Plateforme accessible publiquement
06/02/2025	Tests Post-Déploiement (Sanity Checks)	Testeur QA	17/12/2025	18/12/2025	2	6.1 (FD)	0	Vérification fonctionnelle post-déploiement
06/03/2025	Lancement Officiel &	Chef de Projet	19/12/2025	19/12/2025	1	6.2 (FD), 5.5 (FD)	0	Annonce publique du lancement

2025	Communication	t, Resp . Marketing						
06/04/2025	Surveillance Performance & Utilisateurs	Ingénieur DevOps, Support	20/12/2025	31/12/2025	8	6.3 (FD)	0	Suivi des métriques, feedback
06/05/2025	Jalon : Lancement MVP Réussi	Chef de Projet	31/12/2025	31/12/2025	0	6.4 (FD)	0	Plateforme fonctionnelle et utilisée

→ **Diagramme de Gantt:**

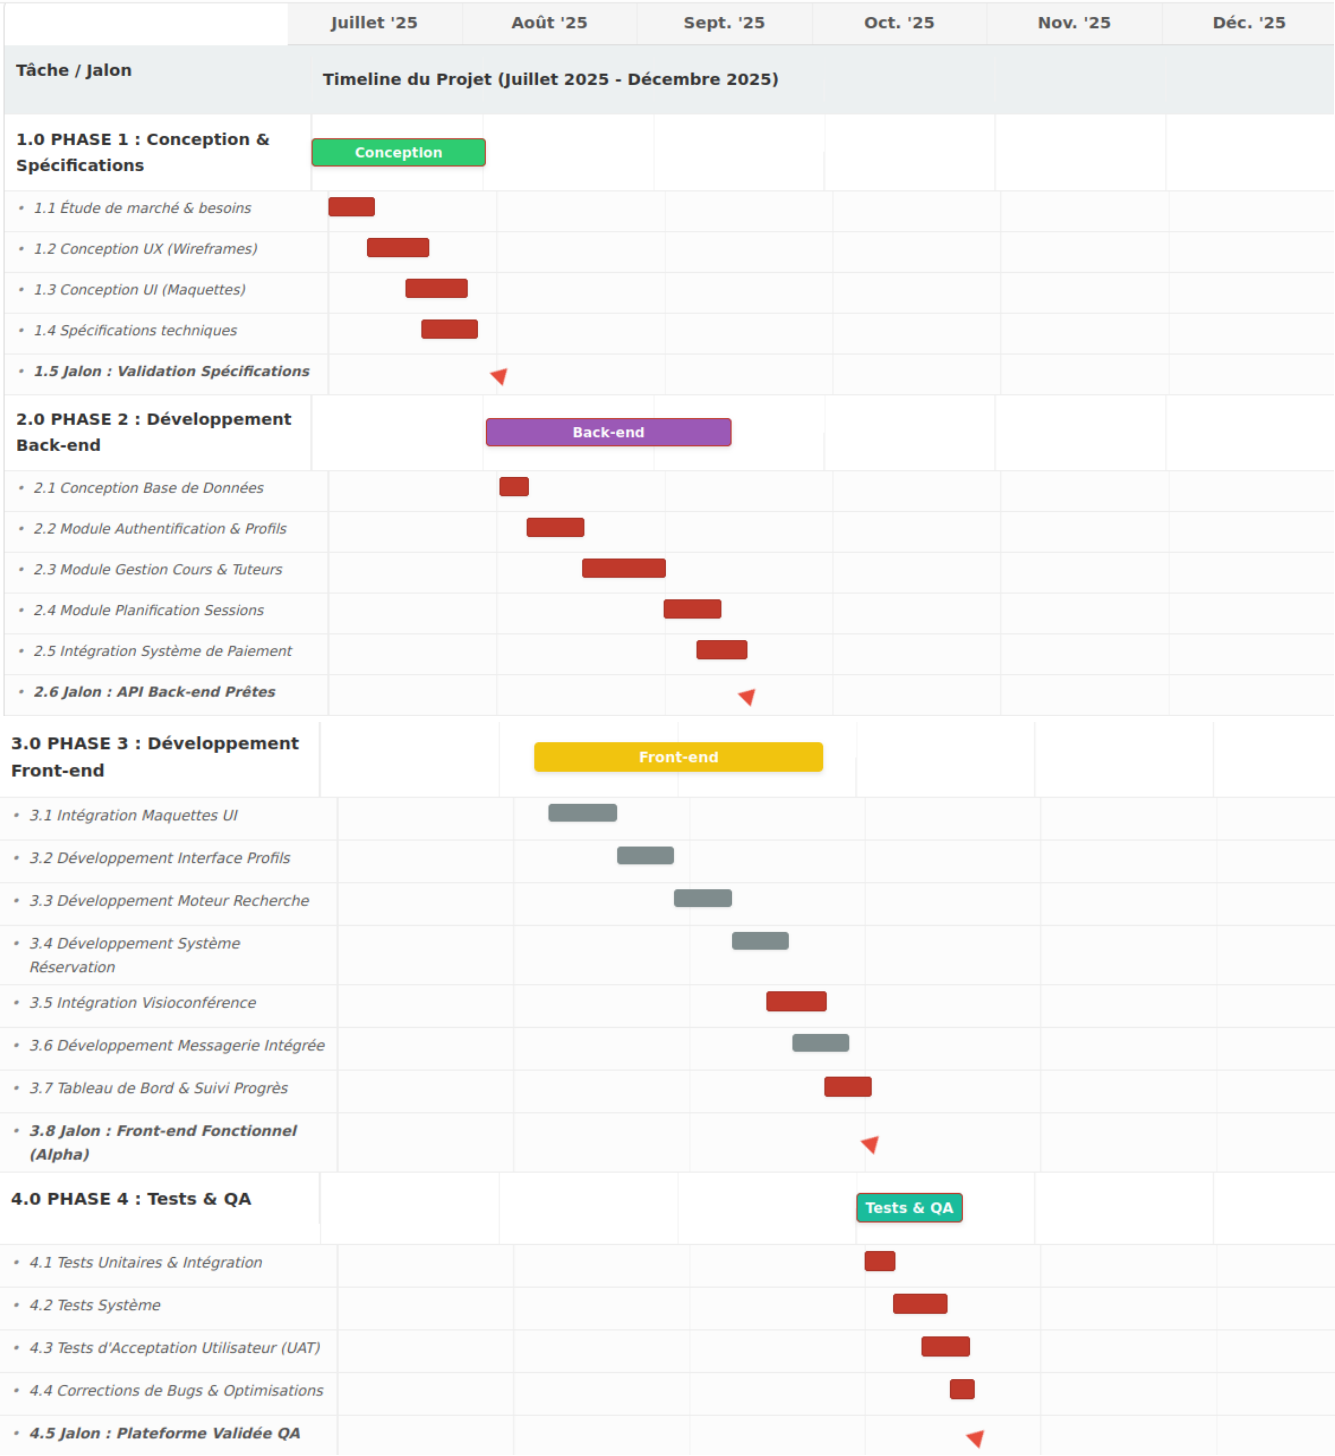

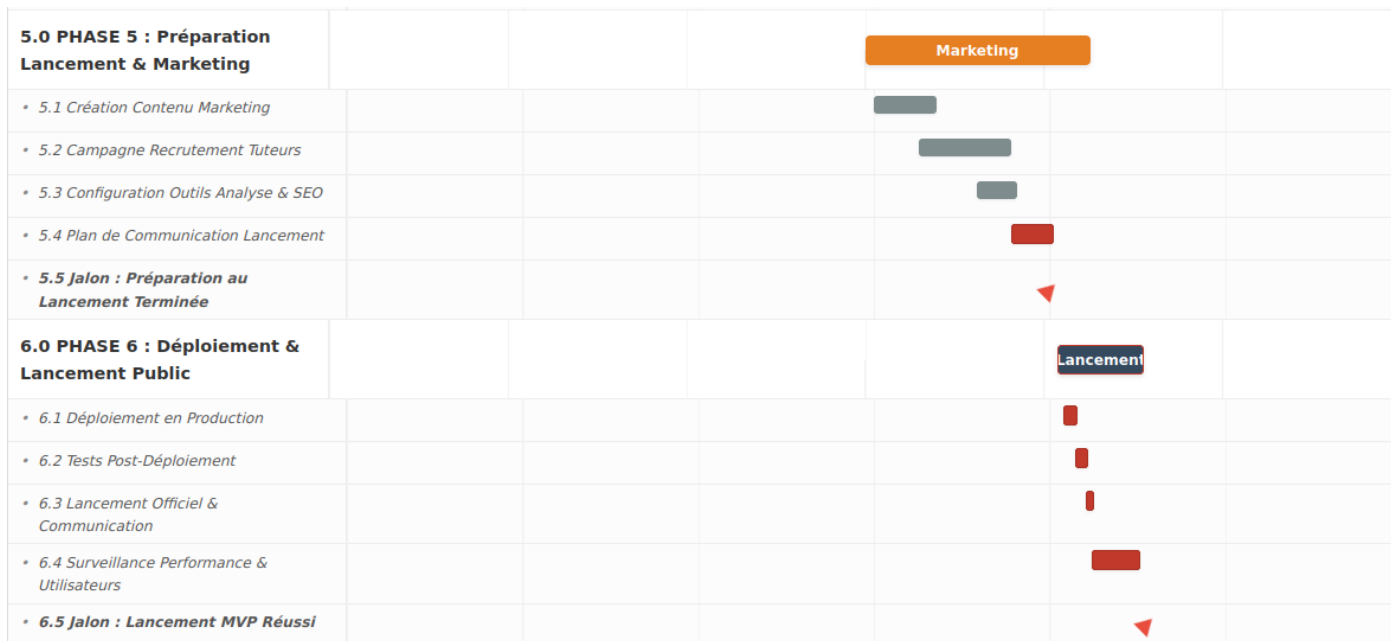


8. Gestion des Risques

Risque Potentiel	Probabilité	Impact	Plan d'Atténuation
Retards de développement	Moyenne	Élevé	Planification agile, découpage en petites tâches, suivi régulier, marge de manœuvre.
Bugs majeurs après déploiement	Moyenne	Élevé	Tests rigoureux (unitaires, intégration, système, acceptation), phases de bêta-test.
Faible adoption par les utilisateurs	Moyenne	Élevé	Étude de marché approfondie, UI/UX intuitif, marketing ciblé, offres promotionnelles au lancement.
Problèmes de sécurité des données	Faible	Très élevé	Audits de sécurité réguliers, chiffrement des données, respect des normes RGPD/LOPD, authentification forte.
Concurrence forte	Moyenne	Moyenne	Différenciation par des fonctionnalités uniques, un prix compétitif, une qualité de service supérieure.
Difficulté à trouver des tuteurs qualifiés	Faible	Moyen	Campagnes de recrutement ciblées, processus de sélection rigoureux, avantages attractifs pour les tuteurs.
Problèmes de performance de la plateforme	Moyenne	Moyen	Tests de charge, optimisation du code, architecture scalable, choix d'un hébergeur performant.

9. Budget du Projet

Catégorie de Dépenses	Budget Alloué (EUR)	Dépenses Réelles (EUR)	Écart (EUR)
-----------------------	---------------------	------------------------	-------------

Ressources Humaines	150000	145000	5000
Logiciels & Outils	8000	9500	-1500
Infrastructure	5000	4800	200
Marketing & Lancement	15000	16000	-1000
Contingences	17000	5000	12000
Total	195000	180300	14700

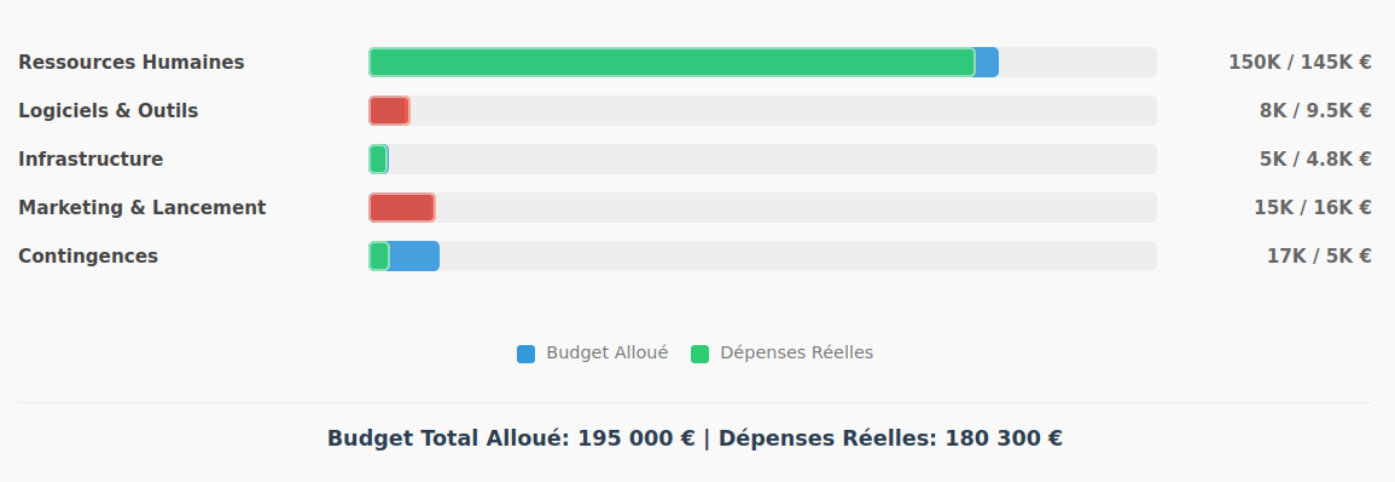

10. Plan de Communication

- **Réunions d'équipe quotidiennes (stand-up) :** 15 minutes, pour le suivi des tâches et blocages.
- **Réunions hebdomadaires du projet :** 1 heure, pour faire le point sur l'avancement, les risques, les décisions.
- **Rapports d'avancement mensuels :** Au sponsor et aux parties prenantes clés.
- **Plateforme de collaboration :** Slack/Microsoft Teams pour la communication instantanée.
- **Outil de gestion de projet :** Jira, Trello, Asana pour le suivi des tâches et des livrables.
- **Canaux de communication avec les utilisateurs (post-lancement) :** Messagerie intégrée, support email, FAQ, réseaux sociaux.

Quoi (Informations)	Qui (Cible)	Pourquoi (Objectif)	Quand (Fréquence)	Comment (Format/Canal)	Par Qui (Responsable)
Avancement des tâches	Équipe de Développement	Suivi, coordination, blocages	Quotidien	Réunion Stand-up (15 min)	Tech Lead
Rapport d'avancement	Sponsor, Parties Prenantes Clés	Vue d'ensemble du projet	Hebdomadaire	E-mail + Réunion (1h)	Chef de Projet
Alerte de Risque Majeur	Sponsor, Chef de Projet	Prise de décision urgente	Ad hoc (immédiat)	E-mail + Appel téléphonique	Propriétaire du Risque
Revue de Design UI/UX	Designer, Tech Lead, Chef de Projet	Validation des maquettes	Bimensuel	Réunion de revue, Figma	Designer
Notifications système	Apprenants, Tuteurs	Informations importantes (mise à jour, maintenance)	Ad hoc	Notifications in-app, E-mail	Chef de Produit / Support
Newsletter de lancement	Grand Public / Utilisateurs potentiels	Promotion, annonce	Mensuel pré-lancement	E-mail, Réseaux sociaux	Responsable Marketing

11. Plan de Qualité

- **Tests Unitaires** : Chaque module de code sera testé individuellement.
- **Tests d'Intégration** : Vérification de l'interaction entre les différents modules.
- **Tests Système** : Test de l'ensemble de la plateforme dans un environnement simulant la production.
- **Tests d'Acceptation Utilisateur (UAT)** : Les futurs utilisateurs (apprenants et tuteurs) testeront la plateforme pour valider qu'elle répond à leurs besoins.
- **Tests de Performance et de Sécurité** : Évaluation de la robustesse, de la vitesse et de la sécurité de la plateforme.
- **Revues de code** : Les développeurs se reliront mutuellement le code pour assurer la qualité et identifier les erreurs.
- **Collecte de Feedback** : Mise en place de sondages et de formulaires de feedback après le lancement pour l'amélioration continue.

12. Plan de Gestion des Changements

Toute demande de modification de la portée, du calendrier ou du budget du projet devra suivre un processus formel :

1. **Soumission de la Demande** : La demande de changement est formulée et documentée.
2. **Analyse d'Impact** : Évaluation de l'impact du changement sur le calendrier, le budget, la qualité et les ressources.
3. **Approbation** : La demande est soumise au chef de projet et au sponsor pour approbation.
4. **Implémentation** : Une fois approuvée, le changement est intégré au plan de projet.
5. **Communication** : Les parties prenantes sont informées du changement et de son impact.



13. Plan de Clôture du Projet

- **Vérification de l'Achèvement** : S'assurer que tous les livrables ont été complétés et acceptés.

- **Transfert des Connaissances** : Documentation finale, formation de l'équipe de maintenance et de support.
- **Bilan du Projet** : Analyse des réussites, des échecs, des leçons apprises.
- **Clôture Administrative** : Libération des ressources, clôture des contrats avec les fournisseurs.
- **Célébration** : Reconnaissance des efforts de l'équipe.

