

Étude de Faisabilité et Cadrage Projet : ProjeXpert

Projet : Création d'une application web collaborative de
gestion de projet

Date : 29 juin 2025

Rédigé par

Massaid Safia

Révolutionnez la Gestion de Vos Projets

Table des Matières

- 1. Introduction**
 - a. 1.1 Contexte et Problématique
 - b. 1.2 Solution Proposée : ProjeXpert
- 2. Objectifs du Projet**
 - a. 2.1 Objectifs Stratégiques
 - b. 2.2 Objectifs Opérationnels
- 3. Périmètre du Projet**
 - a. 3.1 Fonctionnalités Incluses
 - b. 3.2 Fonctionnalités Exclues
 - c. 3.3 Livrables Clés
- 4. Organisation et Gouvernance**
 - a. 4.1 Structure de l'Équipe Projet
 - b. 4.2 Rôles et Responsabilités
 - c. 4.3 Instances de Pilotage
- 5. Planning Prévisionnel et Jalons**
 - a. 5.1 Phases du Projet
 - b. 5.2 Jalons Principaux
- 6. Tâches Détaillées par Phase**
 - a. 6.1 Phase 1 : Initialisation
 - b. 6.2 Phase 2 : Conception
 - c. 6.3 Phase 3 : Développement
 - d. 6.4 Phase 4 : Tests & Recette
 - e. 6.5 Phase 5 : Déploiement
- 7. Tableau Synthétique des Tâches et Dates**
- 8. Diagramme de Gantt & Chemin Critique**
- 9. Gestion des Risques**
 - a. 9.1 Identification des Risques Majeurs
 - b. 9.2 Stratégies d'Atténuation
- 10. Budget Prévisionnel**
 - a. 10.1 Répartition par Phase
 - b. 10.2 Coûts Détaillés
- 11. Plan de Communication**
 - a. 11.1 Fréquence et Formats
 - b. 11.2 Parties Prenantes

1. Introduction

1.1 Contexte et Problématique

Dans le paysage professionnel actuel, la gestion de projet est devenue un pilier essentiel pour la réussite des initiatives. Cependant, de nombreuses organisations font face à des défis persistants qui entravent l'efficacité de leurs projets :

- **Manque d'outils centralisés** : Les informations sont dispersées sur divers supports (feuilles de calcul, e-mails, documents partagés), rendant le suivi et la consolidation difficiles.
- **Difficulté à suivre l'avancement en temps réel** : Les tableaux de bord sont souvent mis à jour manuellement, entraînant des retards et des informations obsolètes.
- **Processus de collaboration fragmentés** : La communication inter-équipes manque de fluidité, générant des silos d'information et des incompréhensions.
- **Délais et budgets dépassés** : Une visibilité insuffisante sur les ressources et le calendrier mène fréquemment à des retards et des surcoûts.

Ces problématiques conduisent à une perte de productivité, une frustration des équipes et, in fine, à l'échec de projets pourtant prometteurs.

1.2 Solution Proposée : ProjeXpert

Pour répondre à ces défis, nous proposons le développement de **ProjeXpert**, une **application web collaborative complète** dédiée à la gestion de projet. ProjeXpert vise à simplifier et optimiser l'intégralité du cycle de vie du projet, de la planification à l'analyse post-déploiement.

L'objectif principal de ProjeXpert est de fournir une **interface intuitive** et des **outils avancés de collaboration** pour permettre aux équipes de **planifier, exécuter, suivre et analyser** leurs projets avec une efficacité inégalée et des résultats concrets.

2. Objectifs du Projet

Les objectifs de ProjeXpert se déclinent sur deux niveaux : stratégique pour la vision globale et opérationnel pour les résultats mesurables.

2.1 Objectifs Stratégiques

- **Digitaliser la gestion de projet** : Faire passer l'organisation vers une gestion de projet entièrement numérique et centralisée.

- **Améliorer la transparence** : Offrir une visibilité complète sur l'état d'avancement de tous les projets aux parties prenantes.
- **Renforcer la collaboration** : Faciliter les échanges et le travail d'équipe entre les différents contributeurs du projet.
- **Optimiser l'allocation des ressources** : Permettre une meilleure gestion des ressources humaines et matérielles à travers les projets.

2.2 Objectifs Opérationnels

- Permettre le **suivi en temps réel** de l'avancement des tâches et des jalons.
- **Réduire de 25%** les délais d'exécution moyens des projets sur les 12 mois suivant le déploiement.
- Atteindre un taux d'**adoption de 80%** par les utilisateurs cibles dans les deux mois suivant le lancement.
- Obtenir un score de **satisfaction utilisateur moyen supérieur à 4/5** (sur une échelle de 1 à 5) six mois après le lancement.
- Fournir des **rapports automatiques** sur la performance du projet (budget, avancement, risques) avec une fréquence configurable.

3. Périmètre du Projet

Le périmètre définit clairement ce qui sera inclus et exclu du développement de ProjeXpert.

3.1 Fonctionnalités Incluses

ProjeXpert inclura les modules et fonctionnalités suivants :

- **Gestion des Projets** : Création, modification, archivage de projets avec statut et description détaillée.
- **Planification & Jalons** : Définition de phases, de jalons clés et de leurs dates.
- **Gestion des Tâches** : Création, affectation, suivi de l'état (à faire, en cours, terminé), dates limites, priorité.
- **Diagramme de Gantt Interactif** : Visualisation graphique du planning des tâches et de leurs dépendances.
- **Tableau Kanban** : Visualisation de l'avancement des tâches sous forme de tableau (drag-and-drop).
- **Suivi Budgétaire** : Saisie des dépenses prévisionnelles et réelles, reporting financier par projet/tâche.
- **Gestion Documentaire** : Partage et stockage sécurisé des documents liés au projet.

- **Espace de Discussion** : Messagerie intégrée par projet/tâche pour la collaboration.
- **Gestion des Utilisateurs & Rôles** : Attribution de rôles (administrateur, chef de projet, membre d'équipe) avec permissions dédiées.
- **Tableaux de Bord & Rapports** : Indicateurs clés de performance (KPI), avancement global, rapports personnalisables.

3.2 Fonctionnalités Exclues

Les fonctionnalités suivantes ne feront pas partie de la version initiale de ProjeXpert, mais pourront être considérées pour des versions futures :

- Intégration directe avec des systèmes ERP ou CRM existants (via API générique possible, mais pas d'intégration spécifique métier).
- Fonctionnalités avancées de gestion de portefeuille de projets (PPM).
- Module de facturation ou de comptabilité.
- Application mobile native (une version responsive web sera privilégiée initialement).
- Gestion des ressources humaines avancée (ex: gestion des congés, des compétences).

3.3 Livrables Clés

Les principaux livrables attendus à la fin du projet incluent :

- **Application Web ProjeXpert** : Code source fonctionnel et déployable.
- **Documentation Technique** : Architecture, APIs, guides de déploiement.
- **Documentation Utilisateur** : Guide d'utilisation, FAQ.
- **Plans de Tests & Rapports de Tests** : Assurant la qualité et la conformité aux spécifications.
- **Plan de Formation** : Supports pour la prise en main de l'application.

4. Organisation et Gouvernance

Une structure claire est essentielle pour la bonne conduite du projet.

4.1 Structure de l'Équipe Projet

- **Comité de Pilotage** : Décideurs stratégiques.
- **Chef de Projet** : Responsable global du projet.
- **Équipe de Développement** : Développeurs Frontend, Backend.
- **Équipe QA (Quality Assurance)** : Testeurs.

- **Expert Métier / Product Owner** : Représentant des utilisateurs finaux et garant des besoins.

4.2 Rôles et Responsabilités

- **Comité de Pilotage** : Validation des jalons majeurs, arbitrage des décisions stratégiques, résolution des blocages.
- **Chef de Projet** : Planification, coordination des équipes, suivi de l'avancement, gestion des risques et du budget, communication.
- **Développeurs (Frontend/Backend)** : Conception technique, codage, tests unitaires.
- **Testeurs QA** : Exécution des plans de tests, identification et suivi des anomalies.
- **Product Owner** : Définition et priorisation des fonctionnalités, validation des livrables.

4.3 Instances de Pilotage

- **Réunion de Comité de Pilotage** : Mensuelle, pour les prises de décision stratégiques et la validation des étapes.
- **Réunion d'Équipe Projet** : Hebdomadaire, pour le suivi des tâches, l'identification des difficultés et la coordination.
- **Daily Stand-up** : Quotidien (15 min), pour un point rapide sur l'avancement et les blocages.
- **Sprint Review / Démo** : Bi-hebdomadaire (si méthode Agile), présentation des incréments développés.

5. Planning Prévisionnel et Jalons

Le projet sera découpé en phases distinctes avec des jalons clairs pour marquer l'achèvement d'étapes significatives. La durée totale estimée du projet est de **18 semaines**.

5.1 Phases du Projet

- 1. Phase 1 : Initialisation (Semaines 1-2)**
 - a. Objectif : Définir clairement le projet, ses objectifs et son périmètre.
- 2. Phase 2 : Conception (Semaines 3-5)**
 - a. Objectif : Élaborer l'architecture technique, les spécifications détaillées et les maquettes UI/UX.
- 3. Phase 3 : Développement (Semaines 6-13)**
 - a. Objectif : Construire l'application (backend, frontend, base de données).
- 4. Phase 4 : Tests & Recette (Semaines 14-16)**

- a. Objectif : Vérifier la conformité de l'application aux spécifications et sa stabilité.

5. Phase 5 : Déploiement (Semaines 17-18)

- a. Objectif : Mettre l'application en production et former les utilisateurs.

5.2 Jalons Principaux

- **Jalon 1 (Fin Semaine 2)** : Validation du Cahier des Charges et des spécifications fonctionnelles.
- **Jalon 2 (Fin Semaine 5)** : Validation de l'architecture technique et des maquettes UI/UX.
- **Jalon 3 (Fin Semaine 13)** : Développement Core de l'application terminé (prêt pour les tests intégrés).
- **Jalon 4 (Fin Semaine 16)** : Validation de la Recette Utilisateurs (UAT).
- **Jalon 5 (Fin Semaine 18)** : Déploiement en Production et Lancement Officiel.

6. Tâches Détaillées par Phase

Voici une décomposition des tâches clés pour chaque phase du projet.

6.1 Phase 1 : Initialisation (Semaines 1-2)

- **Tâche 1.1** : Lancement officiel du projet et constitution de l'équipe.
- **Tâche 1.2** : Collecte détaillée des besoins auprès des utilisateurs clés et des parties prenantes.
- **Tâche 1.3** : Analyse des besoins et rédaction du Cahier des Charges (CdC).
- **Tâche 1.4** : Validation du CdC par le Comité de Pilotage.

6.2 Phase 2 : Conception (Semaines 3-5)

- **Tâche 2.1** : Conception de l'architecture technique (base de données, API, composants).
- **Tâche 2.2** : Spécifications techniques détaillées des modules.
- **Tâche 2.3** : Création des maquettes et prototypes UI/UX.
- **Tâche 2.4** : Validation de la conception par les équipes techniques et le Product Owner.

6.3 Phase 3 : Développement (Semaines 6-13)

- **Tâche 3.1** : Mise en place de l'environnement de développement et des outils (CI/CD).
- **Tâche 3.2** : Développement du Backend (API, logique métier, gestion DB).
- **Tâche 3.3** : Développement du Frontend (interface utilisateur, intégration API).

- **Tâche 3.4** : Intégration des différents modules et des composants tiers.
- **Tâche 3.5** : Réalisation des revues de code et optimisation des performances.

6.4 Phase 4 : Tests & Recette (Semaines 14-16)

- **Tâche 4.1** : Rédaction des plans et des scénarios de tests.
- **Tâche 4.2** : Exécution des tests unitaires et d'intégration.
- **Tâche 4.3** : Exécution des tests fonctionnels et de performance.
- **Tâche 4.4** : Lancement de la Recette Utilisateurs (UAT) et collecte des retours.
- **Tâche 4.5** : Correction des anomalies identifiées et re-tests.

6.5 Phase 5 : Déploiement (Semaines 17-18)

- **Tâche 5.1** : Préparation de l'environnement de production.
- **Tâche 5.2** : Déploiement de l'application en production.
- **Tâche 5.3** : Formation des utilisateurs clés et des administrateurs.
- **Tâche 5.4** : Suivi post-lancement et support initial.


7. Tableau Synthétique des Tâches et Dates

N°	Tâche Principale	Phase	Semaine de Début	Semaine de Fin	Durée (Semaines)	Responsable	Statut
1.1	Lancement Projet	Initialisation	1	1	1	Chef de Projet	
1.2	Collecte Besoins	Initialisation	1	2	2	Product Owner	
1.3	Rédaction CdC	Initialisation	2	3.5	1.5	Product Owner	
1.4	Validation CdC	Initialisation	3.5	3.5	0	Comité Pilotage	
2.1	Concep. Architect.	Conception	3.5	5.5	2	Lead Dev	
2.2	Spéc. Techniques	Conception	4	6	2	Lead Dev	

2 · 3	Maquettes UI/UX	Concepti on	4	7	3	UX/UI Designer	
2 · 4	Valid. Conception	Concepti on	7	7	0	Product Owner	
3 · 1	Env. Développement	Développ ement	6.5	7.5	1	Lead Dev	
3 · 2	Développement Backend	Développ ement	7	13	6	Développ eurs	
3 · 3	Développement Frontend	Développ ement	7	12	5	Développ eurs	
3 · 4	Intégration API	Développ ement	12	14	2	Développ eurs	
3 · 5	Revue Code	Développ ement	13	14	1	Lead Dev	
4 · 1	Rédaction Plans Tests	Tests & Recette	13.5	14.5	1	QA Lead	
4 · 2	Tests Unitaires/Intég.	Tests & Recette	14	15.5	1.5	QA Team	
4 · 3	Tests Fonctionnels	Tests & Recette	15	17	2	QA Team	
4 · 4	Recette Utilisateurs	Tests & Recette	16.5	18	1.5	Utilisateu rs Clés	
4 · 5	Correction Anomalies	Tests & Recette	15	17.5	2.5	Développ eurs	
5 · 1	Prépa Production	Déploiem ent	17	18	1	Ops/Dev Ops	

5 · 2	Déploiement Prod	Déploiement	18	18.5	0.5	Ops/Dev Ops	
5 · 3	Formation Utilisateurs	Déploiement	18	19	1	Chef de Projet	
5 · 4	Suivi Post-Lancement	Déploiement	18.5	19	0.5	Chef de Projet	

8. Diagramme de Gantt & Chemin Critique

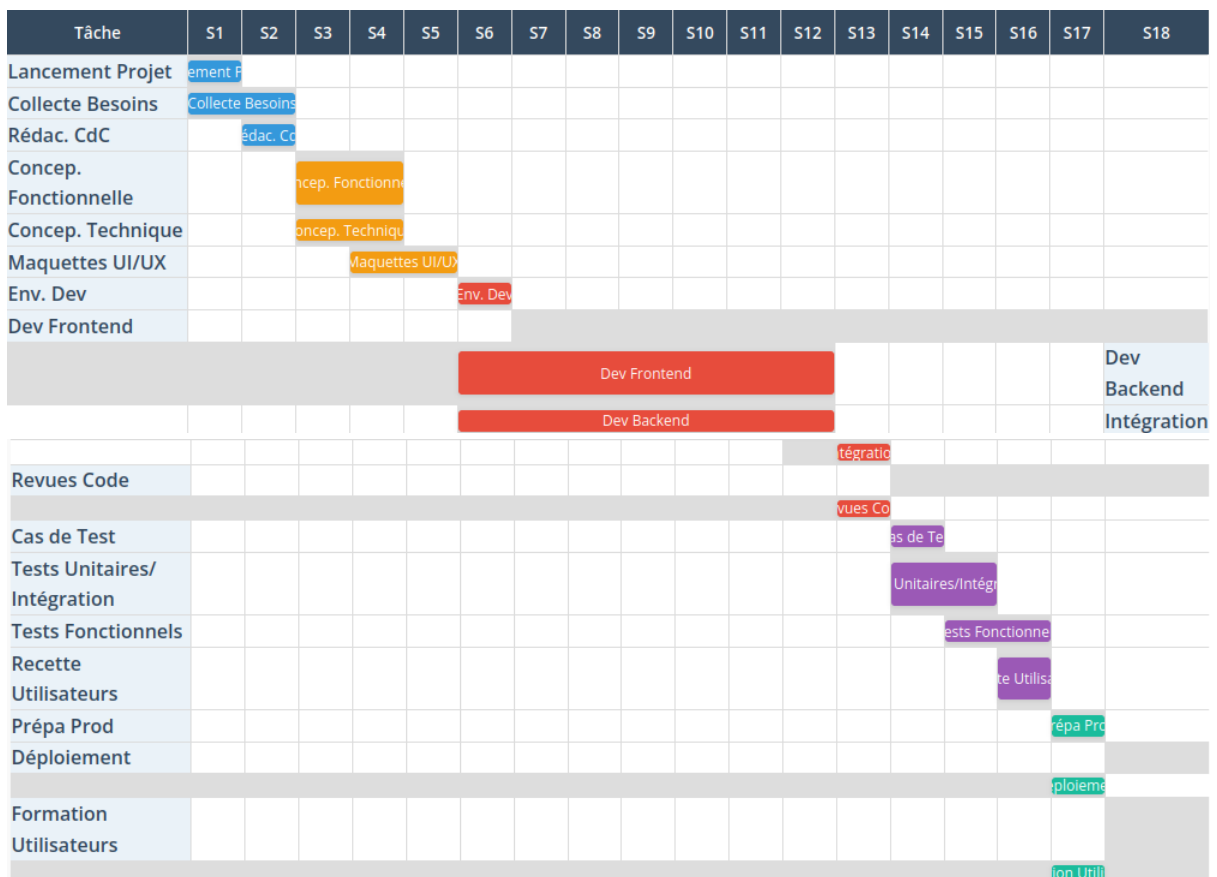


Explication du Diagramme de Gantt :

Ce diagramme visualise le planning détaillé du projet ProjeXpert sur une période de 18 semaines. Chaque barre représente une tâche, sa longueur indique sa durée et sa position sur l'axe du temps son début et sa fin. Les couleurs des barres indiquent les

phases du projet (Initialisation, Conception, Développement, Tests & Recette, Déploiement).

Chemin Critique :

Le chemin critique représente la séquence la plus longue de tâches dépendantes qui détermine la durée minimale du projet. Toute tâche sur le chemin critique qui subit un retard affectera directement la date de fin du projet.

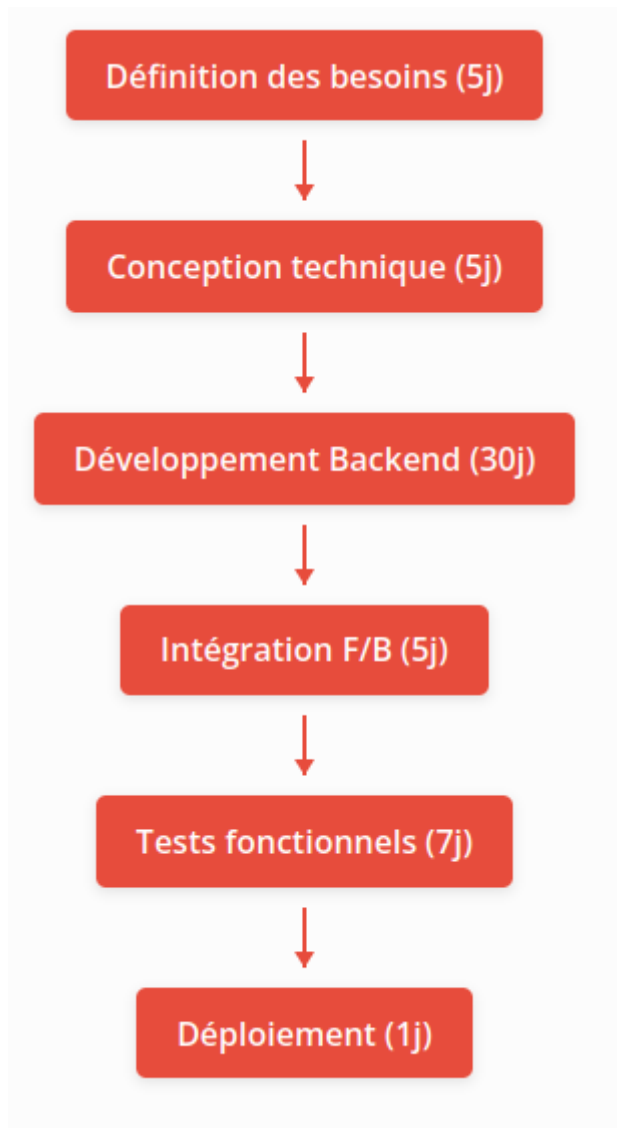

Les tâches identifiées sur le chemin critique sont :

- Lancement Projet
- Collecte des Besoins
- Rédaction Cahier des Charges
- Conception Technique

- Développement Backend
- Intégration API
- Tests Fonctionnels Complets
- Déploiement en Production

La durée totale du chemin critique est estimée à environ **10 semaines (49 jours ouvrés)**, marquant la durée minimale du projet dans des conditions idéales. Une attention particulière sera portée au suivi et à la gestion des tâches critiques pour éviter tout retard.

9. Gestion des Risques


La gestion proactive des risques est essentielle pour minimiser les impacts négatifs sur le projet.

9.1 Identification des Risques Majeurs

R i s q u e	Description	Probabilit é (P)	Im p a c t (I)	Gravi té (P x I)
R 1	Retard de développement	Moyenne (2)	Éle vé (3)	6
	<i>Les tâches de développement prennent plus de temps que prévu en raison de complexités techniques imprévues.</i>			
R 2	Dépassement Budgétaire	Faible (1)	Éle vé (3)	3
	<i>Coûts imprévus (licences, ressources externes) ou mauvaise estimation initiale.</i>			
R 3	Problèmes techniques / bugs critiques	Moyenne (2)	Mo ye n (2)	4
	<i>Découverte de bugs majeurs tard dans le cycle, impactant la qualité et les délais.</i>			
R 4	Résistance au changement des utilisateurs	Élevée (3)	Mo ye	6

			n (2)	
	<i>Difficulté des utilisateurs à adopter la nouvelle application, faible taux d'utilisation.</i>			
R 5	Manque de ressources clés	Faible (1)	Élevé (3)	3
	<i>Départ d'un membre clé de l'équipe ou difficulté à recruter des compétences spécifiques.</i>			

Impact et Probabilité des Risques

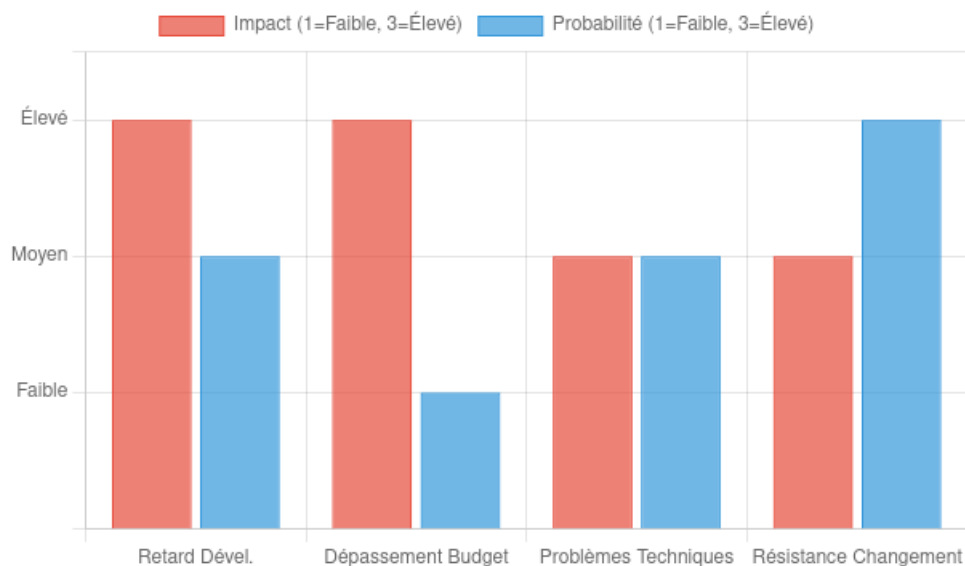

Probabilité vs. Impact des risques identifiés.

9.2 Stratégies d'Atténuation


- **R1 (Retard de développement) :**
 - Mettre en place des sprints courts avec des revues régulières.
 - Réaliser des POC (Proof of Concept) pour les fonctionnalités complexes.
 - Prévoir une petite marge dans le planning pour imprévus.
- **R2 (Dépassement Budgétaire) :**
 - Suivi budgétaire hebdomadaire rigoureux.
 - Mettre en place un processus de validation strict pour les dépenses additionnelles.
 - Négocier des contrats flexibles avec les fournisseurs.
- **R3 (Problèmes techniques / bugs critiques) :**
 - Renforcer les tests unitaires et d'intégration en continu.
 - Mettre en place des revues de code régulières et des outils d'analyse statique.

- Impliquer la QA dès le début du cycle de développement.
- **R4 (Résistance au changement) :**
 - Impliquer les utilisateurs clés dès la phase de conception (Product Owner, UAT).
 - Mettre en place un plan de communication et de formation robuste.
 - Mettre en avant les bénéfices directs pour les utilisateurs.
- **R5 (Manque de ressources clés) :**
 - Documenter au maximum les connaissances techniques (partage de connaissances).
 - Identifier des back-ups potentiels pour chaque rôle clé.
 - Anticiper les besoins en recrutement.

10. Budget Prévisionnel

Le budget prévisionnel est estimé à **40 000 €** et est réparti par phase comme suit :

Budget Prévisionnel par Phase

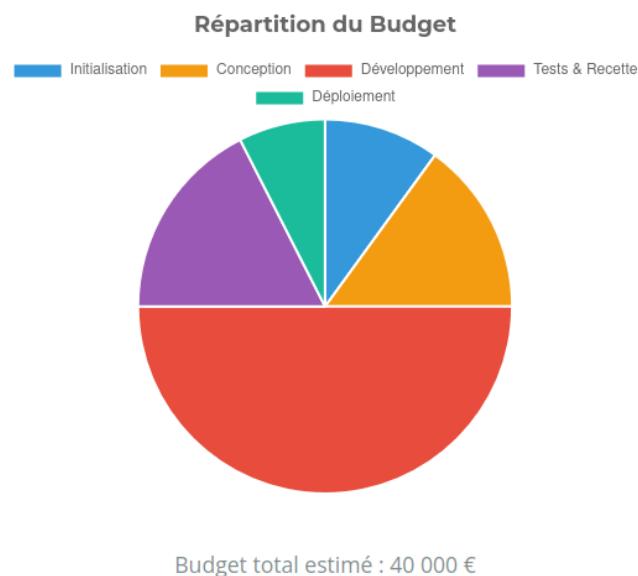

10.1 Répartition par Phase

- **Initialisation** : 4 000 € (10%) - Principalement temps homme pour l'analyse des besoins et la rédaction du CdC.
- **Conception** : 6 000 € (15%) - Temps pour l'architecture, spécifications détaillées, UI/UX.
- **Développement** : 20 000 € (50%) - Coût le plus important, incluant les salaires des développeurs, outils, licences de développement.

- **Tests & Recette** : 7 000 € (17.5%) - Salaires QA, environnement de test.
- **Déploiement** : 3 000 € (7.5%) - Frais d'hébergement initiaux, temps pour le déploiement et la formation.

10.2 Coûts Détaillés (Exemple)

Catégorie de Coût	Détail	Montant Estimé
Ressources Humaines	Équipe de développement (salaires, charges)	30 000 €
	Chef de Projet (temps alloué)	4 000 €
	UX/UI Designer (freelance ou interne)	2 000 €
Logiciels & Licences	Outils de développement, licences spécifiques	1 500 €
Hébergement & Infrastructure	Serveurs, bases de données, CDN (initial)	1 000 €
Services Externes	Audit de sécurité, consultant ponctuel	1 000 €
Divers & Imprévus	(5% du total)	500 €
TOTAL		40 000 €

11. Plan de Communication

Une communication claire et régulière est vitale pour la réussite du projet.

11.1 Fréquence et Formats

- **Réunions d'équipe quotidiennes (Daily Stand-ups)** : 15 minutes, physique ou visio.
 - **Contenu** : Qu'avez-vous fait hier ? Que ferez-vous aujourd'hui ? Y a-t-il des obstacles ?
- **Réunions hebdomadaires d'équipe** : 1 heure, physique ou visio.
 - **Contenu** : Avancement détaillé, revue des tâches, résolution des problèmes, planification de la semaine à venir.
- **Rapports d'avancement bi-mensuels au Comité de Pilotage** : Format écrit (e-mail + document synthétique).
 - **Contenu** : Avancement par rapport aux jalons, état du budget, risques mis à jour, points d'attention.
- **Réunions de revue de sprint / Démonstrations** : Toutes les 2 semaines (si Agile), 1 à 2 heures, présentation interactive.
 - **Contenu** : Démonstration des fonctionnalités développées, recueil des retours, validation des incréments.
- **Communication ad-hoc via outils collaboratifs** : Slack/Microsoft Teams, pour les échanges rapides et les questions urgentes.

11.2 Parties Prenantes

Partie Prenante	Fréquence de Communication	Format	Objectif
Équipe Projet	Quotidien / Hebdomadaire	Daily Stand-ups, Réunions d'équipe	Coordination, Suivi Tâches, Résolution Problèmes
Comité de Pilotage	Bi-mensuel	Rapport écrit, Réunion mensuelle	Décisions Stratégiques, Validation Jalons
Product Owner / Utilisateurs Clés	Hebdomadaire / Ad-hoc	Réunions dédiées, Démonstrations, Slack	Recueil Besoins, Validation Fonctionnalités
Direction Générale	Mensuel (Synthèse CoPil)	Rapport synthétique	Vue d'ensemble stratégique
Utilisateurs Finaux	Ponctuel (avant déploiement)	Sessions de formation, Annonces	Préparation à l'adoption, Formation
